



**Maestría en Gestión de Proyectos**

**Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras  
“Self Storage” en la ciudad de Luque - Paraguay**

Arq. Mónica María Elvira Insfrán Maldonado

Ing. Mauricio Daniel Benítez Yegros

Tutor:  
Mg. Rocío Carolina González

**Asunción, Paraguay**

**Año 2026**

## Carta-pedido de aprobación del anteproyecto

Asunción, xx de julio del 2026

Sr.

**Dr. Gabriel Pereira**

Director de la Escuela de Postgrado

Universidad Americana

Presente

Me dirijo a Usted con el objeto de solicitar la aprobación del título tentativo del Proyecto **“Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque - Paraguay”**, para obtener el título de Magíster en Gestión de Proyectos, bajo la tutoría de Mg. Rocío Carolina González.

La elección del tema responde al crecimiento inmobiliario sostenido, tanto residencial como comercial, que se observa en la Gran Asunción y, en particular, en la ciudad de Luque, el cual ha generado una demanda insatisfecha de espacios de almacenamiento.

El proyecto se encuentra alineado al **Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 9 – Industria, Innovación e Infraestructura**, en tanto propone el desarrollo de infraestructura moderna, modular y adaptable, orientada a fortalecer la industria local de almacenamiento y logística urbana; asimismo, guarda relación con el **ODS N° 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles**, al aportar una solución que optimiza el uso del espacio urbano frente a la creciente densificación de la ciudad.

A nivel nacional, la iniciativa responde al **eje/Pilar 2 del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 (PEN 2050) – Infraestructura, Innovación y Competitividad**, ya que contribuye al desarrollo de infraestructura privada, incorpora soluciones constructivas innovadoras (modularidad y prefabricación metálica) y fortalece la competitividad del sector inmobiliario y logístico del país.

En la espera de una respuesta favorable a la petición, me despido de Usted con mi consideración más distinguida.

Arq. Mónica Insfrán

CI: 2.353.953

+595 982 839021

[insfranmonica@gmail.com](mailto:insfranmonica@gmail.com)

Ing. Mauricio Benítez

CI: 3.405.294

+595 981 569004

[mauriciobenitezyegros@gmail.com](mailto:mauriciobenitezyegros@gmail.com)

Mg. Rocio Gonzalez

CI: 2.022.777

+595 981 549239

[gc.rocio@gmail.com](mailto:gc.rocio@gmail.com)

**DATOS LABORALES ACTUALES**

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Arq. Mónica María Elvira Insfrán Maldonado                           |
| Lugar de Trabajo | Prof. Independiente                                                  |
| Departamento     |                                                                      |
| Cargo            |                                                                      |
| Dirección        | Aregua 719, Asunción                                                 |
| Teléfono         | +595 982 839021                                                      |
| E-mail           | <a href="mailto:insfranmonica@gmail.com">insfranmonica@gmail.com</a> |

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre           | Ing. Mauricio Daniel Benítez Yegros                                                  |
| Lugar de Trabajo | Prof. Independiente                                                                  |
| Departamento     |                                                                                      |
| Cargo            |                                                                                      |
| Dirección        | Aregua 719, Asunción                                                                 |
| Teléfono         | +595 981 569004                                                                      |
| E-mail           | <a href="mailto:mauriciobenitezyegros@gmail.com">mauriciobenitezyegros@gmail.com</a> |

## ÍNDICE GENERAL

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| ASPECTOS GENERALES .....                        | 5  |
| JUSTIFICACIÓN.....                              | 8  |
| PRESENTACIÓN DEL PROYECTO .....                 | 11 |
| MATRIZ DE RESULTADOS.....                       | 14 |
| DETALLE MATRIZ DE RESULTADOS .....              | 18 |
| ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO .....         | 21 |
| ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO .....         | 22 |
| GESTIÓN DEL ALCANCE .....                       | 28 |
| EDT.....                                        | 31 |
| GESTIÓN DEL TIEMPO.....                         | 32 |
| CRONOGRAMA DEL PROYECTO.....                    | 37 |
| GESTIÓN DE COSTOS .....                         | 39 |
| GESTIÓN DE ADQUISICIONES.....                   | 45 |
| MATRIZ DE ADQUISICIONES .....                   | 49 |
| GESTIÓN DE RIESGOS .....                        | 51 |
| MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS .....              | 53 |
| PLAN DE RESPUESTA .....                         | 57 |
| GESTIÓN DE LOS INTERESADOS .....                | 60 |
| MATRIZ DE INTERESADOS .....                     | 62 |
| MATRICES DE DESCRIPCIÓN DE INTERESADOS .....    | 65 |
| GESTIÓN DE COMUNICACIONES .....                 | 76 |
| <b>MATRIZ DE COMUNICACIONES</b> .....           | 79 |
| CONCLUSIÓN.....                                 | 81 |
| LISTA DE ABREVIATURAS.....                      | 84 |
| GLOSARIO.....                                   | 85 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....                 | 88 |
| ANEXO I - MATRIZ DE GESTIÓN DE TIEMPO .....     | 90 |
| ANEXO II - DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO ..... | 93 |
| ANEXO III - CUADRO DE COSTO DETALLADO.....      | 96 |
| ANEXO IV - MATRIZ DE GESTIÓN DE COSTO .....     | 99 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tabla 1 RESUMEN DE COSTOS Y COMPONENTE.....</b>                  | <b>40</b> |
| <b>Tabla 2 CURVA S.....</b>                                         | <b>41</b> |
| <b>Tabla 3 MATRIZ DE ADQUISICIONES .....</b>                        | <b>49</b> |
| <b>Tabla 4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS .....</b> | <b>53</b> |
| <b>Tabla 5 PLAN DE RESPUESTA .....</b>                              | <b>57</b> |
| <b>Tabla 6 MATRIZ DE STAKEHOLDER.....</b>                           | <b>62</b> |
| <b>Tabla 7 DESCRIPCIÓN MATRIZ DE STAKEHOLDER .....</b>              | <b>65</b> |
| <b>Tabla 8 MATRIZ DE COMUNICACIONES .....</b>                       | <b>79</b> |

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| <b>GRÁFICO 1</b> ESTRUCTURA DE GOBERNABILIDAD ORGANIGRAMA ..... | 26 |
| <b>GRÁFICO 2</b> EDT .....                                      | 31 |
| <b>GRÁFICO 3</b> CURVA S .....                                  | 44 |

## **ASPECTOS GENERALES**

El presente proyecto se concibe luego de observar el crecimiento inmobiliario sostenido tanto residencial como comercial en zonas de la Gran Asunción y a nivel país en general por lo cual se plantea la creación de un complejo de depósitos y bauleras bajo la modalidad “Self Storage” en la ciudad de Luque, abarcando desde la adquisición del inmueble hasta la puesta en marcha comercial de las unidades.

Su desarrollo se sustenta en un enfoque estructurado de dirección de proyectos, conforme a los procesos y buenas prácticas descritos por el Project Management Institute (2021), lo que permite ordenar cada etapa bajo criterios de tiempo, costo y calidad definidos previamente.

Con esta iniciativa se busca ofrecer una alternativa concreta de almacenamiento externo tanto para hogares como para pequeñas y medianas empresas de la zona, generando al mismo tiempo un flujo de ingresos estable para quienes invierten en el emprendimiento. Para alcanzar dicho propósito resulta necesario ubicar y adquirir un predio adecuado dentro del distrito, desarrollar el diseño arquitectónico y estructural del complejo, ejecutar la obra civil correspondiente y, finalmente, comercializar cada unidad disponible entre los interesados.

La propuesta contempla un galpón de estructura metálica, dividido internamente mediante paneles desmontables que permiten configurar unidades de distinto tamaño según el tipo de cliente, junto con sistemas de iluminación, control de accesos y videovigilancia orientados a resguardar los bienes depositados. Estos aspectos se organizan en frentes de trabajo

diferenciados, entre los que se incluyen la contratación de servicios de diseño y fiscalización, la ejecución de la obra con su correspondiente supervisión, y la adquisición de los equipos de seguridad y climatización necesarios.

La habilitación del emprendimiento requiere, asimismo, gestionar ante la Municipalidad de Luque los permisos de construcción y funcionamiento correspondientes, atribución que la normativa vigente reconoce expresamente a los gobiernos locales para reglamentar y fiscalizar las edificaciones dentro de su jurisdicción (Congreso de la Nación Paraguaya, 2010).

La ejecución completa demandará 235,4 jornadas de trabajo, comprendidas entre el 1 de julio de 2027 y el 25 de mayo de 2028, con una inversión estimada de Gs. 900.900.000 distribuida entre los cuatro componentes. El avance de una etapa condiciona el inicio de la siguiente: solo una vez asegurado el inmueble pueden avanzar el diseño y los trámites municipales, requisito previo para dar inicio a la construcción y, posteriormente, a la comercialización de los espacios.

Investigaciones recientes sobre el comportamiento de este mercado señalan que la necesidad de espacios externos de guardado crece de manera sostenida junto con la densificación de las ciudades y la reducción de las superficies habitacionales (Echavarria et al., 2024), tendencia que también atraviesa a Luque y a los distritos vecinos de la Gran Asunción, cuya población beneficiaria estará conformada por familias y empresas que requieran soluciones flexibles de almacenamiento, además de los inversores del proyecto. Se espera, como resultado final, contar con un complejo plenamente construido, habilitado y con sus unidades comercializadas, cuyo



éxito se evaluará a partir del nivel de ocupación alcanzado y del cumplimiento del cronograma y el presupuesto originalmente previstos.

## JUSTIFICACIÓN

En la ciudad de Luque y en los distritos que la rodean, la superficie promedio de las viviendas y los locales nuevos se reduce año a año, mientras que la cantidad de bienes que las familias y los pequeños comercios necesitan guardar no deja de crecer. De ahí surge un problema cotidiano y concreto: falta de espacio, y son pocas las alternativas cercanas que hoy lo resuelven.

El mercado local aún no cuenta con una propuesta consolidada de depósitos modulares en alquiler que combine cercanía, flexibilidad de tamaño y seguridad, a pesar de que este tipo de servicio crece de forma constante considerando la densificación urbana en distintas ciudades (Echavarria et al., 2024). Ese vacío es lo que el proyecto busca cubrir en la ciudad de Luque.

La **conveniencia** de desarrollar y analizar este proyecto responde a la existencia de una demanda insatisfecha y verificable correspondiente a la necesidad de espacios de almacenamiento externo, seguros y de acceso flexible, que hoy no encuentra una oferta consolidada en la zona. A la demanda de origen residencial se suma el avance del comercio electrónico, que lleva a emprendedores y pequeñas empresas a requerir un espacio en el que guardar sus mercaderías sin asumir el costo de un local comercial completo, lo que amplía el universo de clientes más allá del uso puramente doméstico. El análisis del proyecto permite determinar, con datos concretos de plazos y costos, si esa necesidad puede transformarse en una propuesta viable.

En el aspecto de **relevancia social**, el proyecto beneficia a dos grupos concretos de la comunidad: las familias de la ciudad de Luque y las zonas cercanas que buscan liberar espacio en sus hogares, así como también a los pequeños negocios que requieren almacenamiento flexible para sostener su operación. El crecimiento poblacional y urbano que atraviesa el país (Instituto Nacional de Estadística, 2024) anticipa que esta necesidad seguirá en aumento, de modo que la solución propuesta responde a una problemática social creciente, vinculada al uso eficiente del espacio en un entorno cada vez más densificado.

Las **implicancias prácticas** se vinculan con la forma de ejecución del proyecto, la adquisición del inmueble, la construcción del tinglado modular y la habilitación municipal se ordenan mediante una Estructura Desglosada del Trabajo, un cronograma y un presupuesto definidos, que permiten controlar cada etapa y corregir a tiempo cualquier desvío antes de que afecte la apertura comercial del complejo. Esa misma base de planificación deja un modelo replicable: al tratarse de una iniciativa con pocos antecedentes formalizados en el mercado paraguayo, la experiencia puede servir de referencia concreta para quienes evalúen instalar complejos similares en otras ciudades del país.

Desde el punto de vista del **valor teórico**, documentar con datos reales de plazos y costos cómo se estructura y ejecuta una iniciativa de auto almacenamiento en Paraguay aporta un caso concreto en un sector todavía poco descripto en la producción académica local, pese a su expansión sostenida a nivel regional. De esta manera, el proyecto no solo aplica las buenas prácticas de la dirección de proyectos, sino que también genera evidencia útil para el estudio de este tipo de emprendimientos en el contexto nacional.

Este complejo de depósitos y bauleras responde a una necesidad de almacenamiento real y creciente en Luque, y su desarrollo bajo una planificación ordenada de tiempos, costos y recursos permite convertir esa necesidad en una propuesta viable y medible en sus resultados.

## **PRESENTACIÓN DEL PROYECTO**

El presente proyecto consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo de depósitos y bauleras bajo la modalidad self storage en la ciudad de Luque, departamento Central. Se prevé levantar un tinglado de estructura metálica de 308 m<sup>2</sup>, cuyo interior se subdivide en bauleras de distintos tamaños, de 2 m<sup>2</sup> a 20 m<sup>2</sup>, equipadas con sistemas de seguridad, control de acceso y áreas de carga y descarga, para su alquiler comercial a hogares y a pequeñas y medianas empresas de la zona.

El proyecto se desarrolla en un predio con acceso directo a las principales vías que conectan Luque con Asunción y con los distritos del área metropolitana. El mercado al que apunta es el del almacenamiento de autoservicio, un sector todavía joven en Paraguay: el primer operador formal del rubro comenzó a funcionar en Asunción en 2019 (Diario HOY, 2019) y desde entonces se sumaron otras propuestas, entre ellas una que ya opera con más de 250 unidades en la propia ciudad de Luque (Extra Metros, s.f.), además de otras firmas activas en distintos puntos de Asunción (Guarde Aquí, s.f.; Más Espacio Paraguay, s.f.). Estos antecedentes confirman un mercado en expansión, con baja densidad de oferta frente a la demanda potencial de la zona.

Esa demanda se explica por dos dinámicas convergentes. Por un lado, la transformación de la vivienda en la Gran Asunción, donde el encarecimiento del suelo reduce el tamaño de las nuevas unidades residenciales y elimina los espacios secundarios de guardado; los estudios del sector señalan que esta reducción del espacio doméstico, junto con la creciente densidad urbana, es uno de los principales motores de la demanda de auto-almacenaje (Echavarria et al.,

2024). Por otro, el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de las pequeñas empresas de acercar su stock a los clientes, en línea con la literatura sobre distribución urbana, que describe cómo los centros de almacenamiento próximos a las zonas de consumo reducen los tiempos y costos del tramo final de entrega (Savelsbergh & Van Woensel, 2016). Ubicada a mitad de camino entre Asunción, San Lorenzo y Fernando de la Mora, una red de bauleras en Luque puede cumplir ese rol para emprendedores que hoy no justifican el costo de un depósito comercial de gran superficie.

El público objetivo combina dos segmentos: personas que atraviesan mudanzas, remodelaciones o simplemente necesitan liberar espacio en casa, y pequeños comercios o emprendedores que requieren guardar mercadería o herramientas sin comprometerse con un contrato comercial de largo plazo. El servicio ofrecido consiste en unidades de depósito de distintos tamaños, alquiladas por metro cuadrado bajo contratos flexibles y con acceso controlado. La solución constructiva elegida, a base de paneles metálicos prefabricados, permite reconfigurar el interior del tinglado sin obra mayor y ajustar la proporción entre unidades pequeñas y grandes según lo que el mercado vaya requiriendo.

El objetivo general del proyecto es construir y poner en funcionamiento el complejo de depósitos y bauleras en la ciudad de Luque, con la totalidad de sus unidades habilitadas para el alquiler comercial, dentro del plazo y el presupuesto previstos. De él se desprende el objetivo específico: *Construir y equipar el tinglado de 308 m<sup>2</sup> con sus bauleras, sistemas de seguridad y áreas de carga y descarga, bajo la supervisión de una fiscalización de obra.*

Como resultado, se espera contar con un complejo plenamente construido, habilitado y con sus unidades listas para la comercialización, cuyo desempeño se medirá por el nivel de ocupación alcanzado y por el cumplimiento del cronograma y del presupuesto originalmente previstos. La ejecución se planifica de manera integrada bajo los procesos de planificación, seguimiento y control que propone el Project Management Institute (2021), de modo que el alcance, el tiempo y el costo se gestionen de forma conjunta desde la adquisición del terreno hasta la apertura comercial.

Para alcanzar el objetivo, el proyecto se estructuró en cuatro componentes y cinco productos. El Componente N.º 1, Inmueble, comprende la adquisición del terreno (Producto 1: Terreno adquirido). El Componente N.º 2, Diseño, Licencias y Permisos, agrupa el proyecto arquitectónico y estructural y la tramitación municipal (Producto 2: Depósito diseñado; Producto 3: Licencias comerciales y permisos municipales obtenidos). El Componente N.º 3, Construcción y Supervisión de Obra, abarca la ejecución física del tinglado y su fiscalización (Producto 4: Galpón con depósitos interiores divididos, construido y equipado). Por último, el Componente N.º 4, Administración del Proyecto, se extiende a lo largo de toda la vida del emprendimiento e incluye la conducción del equipo y la auditoría externa (Producto 5: Equipo de proyecto contratado).

## MATRIZ DE RESULTADOS

El proceso de elaboración de la matriz de resultados para el proyecto "Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras 'Self Storage' en la ciudad de Luque - Paraguay" parte de los cinco productos definidos en su Estructura Desglosada del Trabajo: el terreno, el diseño del depósito, las licencias municipales, el galpón construido y equipado, y el equipo a cargo de la gestión.

Este enfoque asegura que cada indicador tenga un correlato directo con un entregable concreto y verificable, evitando que la medición del avance quede desvinculada de lo efectivamente contratado y ejecutado (Project Management Institute, 2021). La construcción de la matriz sigue, además, el enfoque de gestión orientada a resultados descrito por Ortégón et al. (2005), en el que cada componente del proyecto se traduce en un producto con su indicador, su línea de base y su meta correspondiente.

El objetivo general es la construcción y puesta en funcionamiento, en la ciudad de Luque, del complejo de depósitos y bauleras descrito en el proyecto, con la totalidad de sus unidades habilitadas para el alquiler comercial dentro del plazo y el presupuesto previstos.

El logro de este objetivo general se mide a través del indicador de impacto definido para el proyecto: la utilidad neta por metro cuadrado alquilable generada por las soluciones de almacenamiento, cuya línea de base se fija en 0 al inicio de la ejecución (2027) y cuya meta se establece en 10 Usd/m<sup>2</sup> hacia 2030, una vez transcurridos dos años completos de operación



comercial del complejo, verificada en los registros de contratos y renovaciones. En el nivel de resultado, el indicador correspondiente es la cantidad de metros cuadrados de depósito disponibles para alquiler, con una línea de base de 0 (2027) y una meta de 167 m<sup>2</sup> al cierre del proyecto, en 2028, verificada en los contratos de alquiler.

**En el nivel de productos, cada componente de la Estructura Desglosada del Trabajo cuenta con su propio indicador, alineado con los entregables del proyecto:**

- Terreno adquirido: escritura de compraventa formalizada (Meta: 1 propiedad escriturada en la ciudad de Luque).
- Depósito diseñado: proyecto arquitectónico y diseños estructurales aprobados (Meta: 1 proyecto arquitectónico y sus diseños estructurales visados).
- Licencias comerciales y permisos municipales obtenidos: habilitaciones emitidas por la Municipalidad de Luque (Meta: 1 licencia de construcción y 1 habilitación comercial obtenidas).
- Galpón con depósitos interiores construido y equipado: tinglado terminado según especificaciones (Meta: 1 tinglado de 308 m<sup>2</sup> finalizado, con sus unidades internas divididas y listas para alquilar).
- Equipo de proyecto contratado y auditoría ejecutada: gestión y control externo en funciones (Meta: Coordinador de Proyecto y Especialista Fiduciario contratados; 1 informe de auditoría externa emitido).

**La línea base se establece antes del inicio de la ejecución:**

- Inmueble: sin terreno adquirido en la ciudad de Luque, sin escrituración iniciada.

- Diseño y licencias: sin proyecto arquitectónico ni estructural elaborado, sin licencias ni habilitaciones municipales gestionadas.
- Construcción: sin tinglado construido, sin unidades internas divididas ni equipadas.
- Administración: sin Coordinador de Proyecto ni Especialista Fiduciario contratados, sin auditoría externa gestionada.

Estos elementos se documentan para servir de referencia y medir avances reales una vez iniciada la ejecución.

**Las metas se formulan bajo criterios SMART (específicas, medibles, alcanzables, realistas y con tiempo definido):**

- Terreno escriturado dentro de los 65 días del Componente N.º 1 (08/07/2027 al 06/10/2027), con una inversión de Gs. 120.000.000.
- Proyecto arquitectónico y estructural aprobado dentro de los 42 días del Producto 2 (08/09/2027 al 04/11/2027), con una inversión de Gs. 30.000.000.
- Licencias y habilitaciones obtenidas dentro de los 52 días del Producto 3 (11/10/2027 al 21/12/2027), con una inversión de Gs. 35.000.000.
- Tinglado de 308 m<sup>2</sup> construido y equipado dentro de los 150,4 días del Componente N.º 3 (28/10/2027 al 25/05/2028), con una inversión de Gs. 583.000.000.
- Equipo de gestión activo durante todo el ciclo del proyecto (01/07/2027 al 25/05/2028), con auditoría externa concluida en los últimos 25 días, por una inversión conjunta de Gs. 132.900.000.

**Los medios de verificación incluyen:** escritura pública de compraventa del terreno en la ciudad de Luque, planos y proyecto arquitectónico-estructural visados, licencia de construcción

y habilitación comercial municipal, acta de recepción de obra del tinglado e informes de fiscalización, contratos del Coordinador de Proyecto y del Especialista Fiduciario, e informe final de auditoría externa. Los responsables principales son el Coordinador de Proyecto, el Especialista Fiduciario, la empresa constructora contratada, la fiscalización de obra, el administrador a cargo de las gestiones municipales y los auditores externos contratados.

## DETALLE MATRIZ DE RESULTADOS

Este proyecto busca brindar soluciones prácticas de almacenamiento para clientes residenciales y corporativos, generando renta para sus inversores mediante la construcción de un complejo de depósitos modulares “Self Storage” compuesto por bauleras de distintos tamaños, equipado con sistemas de seguridad avanzados y áreas de carga y descarga, y plenamente operativo para el alquiler comercial de sus unidades. Su ejecución se planifica de forma integral, abarcando la adquisición del inmueble, el diseño del complejo, la obtención de las licencias municipales y la construcción de la obra, ajustada a los plazos y al presupuesto definidos para el proyecto.

### **El objetivo específico es:**

- (i) Construir y equipar un tinglado de 308 m<sup>2</sup> con bauleras de distintos tamaños, sistemas de seguridad (control de acceso digital, CCTV y alarmas) y áreas de carga y descarga, bajo la supervisión de una fiscalización de obra contratada para tal fin.

| Matriz de Resultados                                                      |                                                                                                                                                                  |               |      |       |       |                                       |                          |               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|-------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Proyecto:                                                                 | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque - Paraguay                                                 |               |      |       |       |                                       |                          |               |
| Objetivo General                                                          | Construir un complejo de depósitos y bauleras con unidades habilitadas para el alquiler comercial en la ciudad de Luque                                          |               |      |       |       |                                       |                          |               |
| Objetivo Específico                                                       | Construir y equipar el tinglado de 308 m² con sus bauleras, sistemas de seguridad y áreas de carga y descarga, bajo la supervisión de una fiscalización de obra. |               |      |       |       |                                       |                          |               |
| IMPACTO                                                                   |                                                                                                                                                                  |               |      |       |       |                                       |                          |               |
| Indicadores                                                               | Unidad de medida                                                                                                                                                 | Línea de base |      | Metas |       | Medio de verificación                 | Observaciones            |               |
|                                                                           |                                                                                                                                                                  | Valor         | Año  | Valor | Año   |                                       |                          |               |
| Impacto esperado                                                          |                                                                                                                                                                  |               |      |       |       |                                       |                          |               |
| Utilidad neta por m2 alquilable generado por soluciones de almacenamiento | Usd/Mts2                                                                                                                                                         | 0             | 2027 | 10    | 2030  | Registros de contratos y renovaciones |                          |               |
| RESULTADOS                                                                |                                                                                                                                                                  |               |      |       |       |                                       |                          |               |
| Resultados Esperados                                                      | Unidad de medida                                                                                                                                                 | Línea de base |      |       | Metas |                                       | Medio de verificación    | Observaciones |
|                                                                           |                                                                                                                                                                  | Valor         | Año  |       | Valor | Año                                   |                          |               |
| Resultado esperado 1                                                      |                                                                                                                                                                  |               |      |       |       |                                       |                          |               |
| # de metros m2 de depósito disponible para alquiler                       | m2                                                                                                                                                               | 0             | 2027 |       | 167   | 2028                                  | Contratos de alquileres. |               |

| PRODUCTOS                                                        |                     |                             |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |            |                                                   |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Productos                                                        | Costo estimado (Gs) | Unidad de medida            | Línea de base | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Meta final | Medio de verificación                             | Observaciones                                                                   |
| Componente 1: Inmueble                                           |                     |                             |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |            |                                                   |                                                                                 |
| Terreno adquirido                                                | Gs.<br>120.000.000  | Terreno                     |               |       |       |       | 1     |       |       |       |       |       |        |        |        | 1          | Contrato de compraventa de terreno                | Terreno de 368 m2                                                               |
| Componente 2: Diseño, Licencias y permisos                       |                     |                             |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |            |                                                   |                                                                                 |
| Depósito diseñado                                                | Gs.<br>30.000.000   | # Documento                 |               |       |       |       |       | 1     |       |       |       |       |        |        |        | 1          | Proyecto y diseño arquitectónico aprobado         |                                                                                 |
| Licencias comerciales y permisos municipales obtenidas           | Gs.<br>35.000.000   | # Documento                 |               |       |       | 1     |       |       |       |       |       |       |        |        |        | 1          | Aprobación del proyecto por la Municipalidad.     |                                                                                 |
|                                                                  |                     |                             |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |            | Licencia comercial aprobada por la Municipalidad. |                                                                                 |
| Componente 3: Construcción y supervisión de obra                 |                     |                             |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |            |                                                   |                                                                                 |
| Galpón construido con depósitos interiores divididos y equipados | Gs.<br>583.000.000  | Unidad de Galpón construido |               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        | 1      |        | 1          | Certificado final de obra.                        | Incluye construcción (Gs. 570.000.000) y fiscalización de obra (Gs. 13.000.000) |

## **ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO**

El Acta de Constitución del Proyecto es el documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto y que documenta, de manera preliminar, los requisitos que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados, otorgando al equipo responsable la autoridad para emplear los recursos en las actividades previstas (Project Management Institute, 2021).

Este documento constituye la referencia inicial del proyecto y facilita la comunicación de su propósito a los distintos interesados. El Acta del presente proyecto se elabora a partir de los cuatro componentes definidos en su Estructura Desglosada del Trabajo (Inmueble, Diseño, Licencias y Permisos, Construcción y Supervisión de Obra, y Administración del Proyecto), estableciendo de manera preliminar el alcance, el tiempo, el costo y la estructura de gobernabilidad que autorizan formalmente el inicio de la ejecución.

## ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque - Paraguay |
| <b>ID:</b>       | PROY-STO-2026-001                                                                                                |
| <b>Periodo:</b>  | 01/07/2027 – 25/05/2028                                                                                          |

### Racionalidad y Propósito del Proyecto

El crecimiento inmobiliario sostenido, tanto residencial (departamentos con superficies cada vez más reducidas) como comercial (comercio electrónico y pymes que requieren stock flexible), en la ciudad de Luque y en las zonas aledañas de la Gran Asunción, generó una demanda insatisfecha de espacios de almacenamiento seguro, modular y de fácil acceso. El propósito de este proyecto es construir una infraestructura moderna de self storage que optimice el uso del suelo y genere un modelo de negocio de alta rentabilidad, basado en ingresos recurrentes por el alquiler de bauleras de diversos tamaños.

### Objetivos del Proyecto

El objetivo principal del proyecto es ***Construir un complejo de depósitos y bauleras con unidades habilitadas para el alquiler comercial en la ciudad de Luque.***

El objetivo específico es ***Construir y equipar el tinglado de 308 m<sup>2</sup> con sus bauleras, sistemas de seguridad y áreas de carga y descarga, bajo la supervisión de una fiscalización de obra.***

### Estrategia del Proyecto

La estrategia del proyecto contempla los siguientes puntos:

#### Alcance del proyecto

El proyecto se basa en un modelo de intervención de desarrollo de infraestructura modular con base tecnológica: la adquisición de un terreno estratégico en la ciudad de Luque, la construcción de una nave industrial cuyo interior se subdivide mediante paneles metálicos prefabricados en módulos de 2 m<sup>2</sup> a 20 m<sup>2</sup>, y la incorporación de un componente tecnológico



para la automatización de accesos y la gestión comercial. El proyecto genera los siguientes productos principales:

- **Infraestructura base:** nave industrial techada con aislamiento térmico, pisos industriales de alta resistencia con tratamiento antipolvo y sistema de drenaje pluvial estanco.
- **Módulos de almacenamiento (bauleras):** estructuras divisorias metálicas modulares, con puertas enrollables o batientes con opción de candado o cerradura inteligente.
- **Sistema de seguridad integrado:** CCTV de alta definición y visión nocturna, sensores de movimiento, alarmas contra incendios y cerco perimetral.
- **Control de acceso automatizado:** portón principal e ingresos peatonales con lectores de códigos QR, pines o tarjetas magnéticas.
- **Oficina administrativa y área de carga:** espacio de atención al cliente, sanitarios y zona techada de estacionamiento logístico para carga y descarga.
- **Plataforma digital:** página web corporativa con sistema de pagos integrado para reservas y cobros recurrentes.
- **Documentación legal:** planos aprobados por la Municipalidad de Luque, licencia ambiental y habilitación comercial finalizadas.
- **Cobertura de seguros:** póliza global del edificio contra siniestros mayores, con opción de contratación de seguros individuales por el valor de lo guardado.

#### **Límites del alcance**

- **Servicio de mudanza o flete propio:** el proyecto proveerá carritos internos de carga, pero no adquirirá vehículos de transporte ni ofrecerá traslado de bienes.
- **Bauleras refrigeradas:** no se contempla la instalación de sistemas de refrigeración industrial ni control de temperatura extrema en esta primera etapa.
- **Vigilancia física armada 24/7:** la seguridad se basa principalmente en tecnología y monitoreo remoto tercerizado, con la contratación de un solo guardia o sereno.

#### **Cronograma Resumido**

El cronograma se organiza según los cuatro componentes definidos en la Estructura Desglosada del Trabajo, con una duración total de 235,4 días, desde el 1 de julio de 2027 hasta el 25 de mayo de 2028.

| Hito                                                                       | Descripción                                                                                                                                                           | Plazo Estimado                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cierre del Componente<br><b>N.º 1 – Inmueble</b>                           | Comprende la adquisición de un terreno estratégico de 368 m².                                                                                                         | 65 días hábiles<br>(cierre en el Trimestre 2 – Año 1)  |
| Cierre del Componente<br><b>N.º 2 – Diseño, Licencias y Permisos</b>       | Estudios de suelo, diseño ejecutivo finalizado y presentación de planos a la Municipalidad. Obtención de licencias.                                                   | 75 días hábiles<br>(cierre en el Trimestre 2 – Año 1)  |
| Cierre del Componente<br><b>N.º 3 – Construcción y Supervisión de Obra</b> | Contratación de constructora y fiscalización. Construcción y equipamiento de obra.                                                                                    | 150 días hábiles<br>(cierre en el Trimestre 4 – Año 1) |
| Cierre del Componente<br><b>N.º 4 – Administración del Proyecto</b>        | Pruebas operativas del software de gestión, testeos de seguridad y habilitación municipal. Apertura oficial del complejo e inicio del plan de marketing de absorción. | 228 días hábiles<br>(cierre en el Trimestre 4 – Año 1) |

Los plazos se expresan en días hábiles, conforme a la programación del cronograma. Los trimestres se computan a partir del inicio de la ejecución, el 1 de julio de 2027, de modo que el Trimestre 1 comprende de julio a septiembre de 2027; el Trimestre 2, de octubre a diciembre de 2027; el Trimestre 3, de enero a marzo de 2028; y el Trimestre 4, de abril a mayo de 2028.

### Presupuesto

El presupuesto total asciende a **G 900.900.000 (guaraníes)**, distribuidos en:

| Componentes  | Descripción                        | Monto                |
|--------------|------------------------------------|----------------------|
| Componente 1 | Inmueble                           | G 120.000.000        |
| Componente 2 | Diseño, Licencias y Permisos       | G 65.000.000         |
| Componente 3 | Construcción y Supervisión de Obra | G 583.000.000        |
| Componente 4 | Administración del Proyecto        | G 132.900.000        |
| <b>Total</b> |                                    | <b>G 900.900.000</b> |

## Riesgos, supuestos y restricciones de alto nivel

### Riesgos principales:

- **Burocrático:** retrasos prolongados en la emisión de la licencia ambiental o en la aprobación de planos por parte de la Municipalidad de Luque.
- **Financiero:** incremento imprevisto en los costos de materiales importados (chapas de acero para las bauleras) debido a inflación o volatilidad cambiaria.
- **Climático:** temporadas de lluvias intensas que detengan las obras civiles en las fases críticas de fundaciones y techado.
- **Comercial:** velocidad de adopción del servicio más lenta de lo esperado por el desconocimiento del concepto de self storage en el mercado local.

### Supuestos:

- El terreno seleccionado cuenta con la zonificación municipal adecuada y acceso a redes de servicios básicos (energía trifásica de la ANDE, agua y fibra óptica).
- Existe una demanda creciente en Luque impulsada por el auge de departamentos y comercios medianos sin depósitos propios.
- Los proveedores locales o regionales de estructuras metálicas modulares cuentan con la capacidad y el stock necesarios para cumplir los plazos de entrega.

### Restricciones:


- **Presupuestaria:** techo financiero estricto definido por los inversionistas; cualquier desfase mayor al 8% requiere reestructuración del alcance.
- **Temporal:** la inauguración debe realizarse en tiempo por compromisos financieros asumidos.

## Estructura de gobernabilidad

La gobernabilidad del proyecto se estructura en cuatro niveles. El Comité de Dirección, integrado por los socios capitalistas (Inversores/Patrocinadores), constituye el máximo órgano de decisión. La Unidad Ejecutora, situada en el nivel operativo, está conformada por el Coordinador de Proyecto, a cargo de la dirección técnica y administrativa en el terreno y responsable de coordinar la obra civil, los equipamientos y los trámites, y por el Especialista Fiduciario, responsable del control financiero y de la ejecución presupuestaria. El Equipo de Ingeniería y Contratistas está compuesto por los profesionales y las empresas tercerizadas contratadas para la ejecución material del proyecto. Por último, el Equipo Legal

y Comercial, integrado por el Gestor Administrativo o Asesor Jurídico y el Consultor de Marketing, respalda los aspectos normativos y de comercialización.

### Gerencia del Proyecto

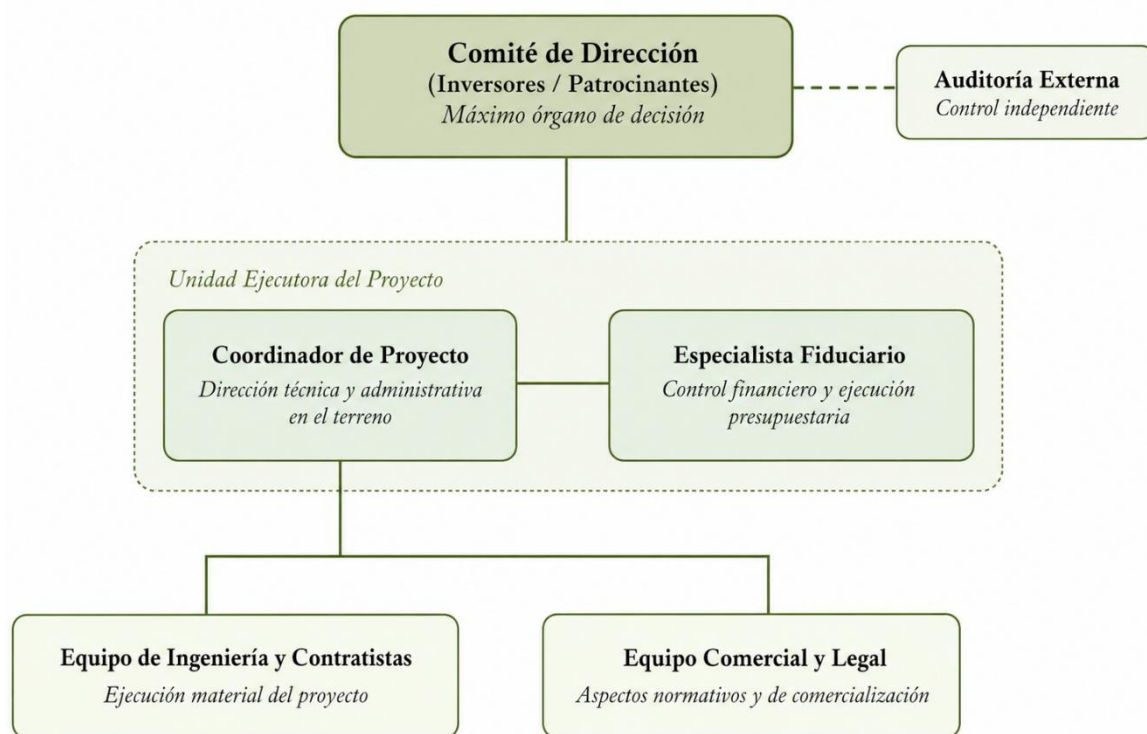

Fuente: elaboración propia

### GRÁFICO 1 ESTRUCTURA DE GOBERNABILIDAD ORGANIGRAMA

#### Control de Cambios

Todas las solicitudes de cambio deben ser presentadas al Coordinador de Proyecto, quien evalúa el impacto técnico y programático, así como las ventajas para el proyecto en relación con los costos y los tiempos. El Coordinador de Proyecto eleva las solicitudes, junto con el análisis correspondiente, al Comité de Dirección para su aprobación; una vez aprobada la solicitud, el Coordinador de Proyecto procede a implementar los cambios.

Se establecen tres canales oficiales de comunicación: un reporte quincenal de avance tipo "semáforo" (verde: en fecha, amarillo: alerta, rojo: retraso) con el avance físico y financiero, los hitos alcanzados y el estado de los riesgos; una reunión mensual de revisión, presencial

o virtual, para aprobar certificaciones de obra y liberar fondos del período siguiente; y un canal de comunicación de emergencia, mediante el cual, ante un riesgo crítico materializado, el Coordinador de Proyecto convoca a una sesión extraordinaria del Comité en un plazo no mayor a 24 horas.

**Aprobado por**

Fecha:

Firma:

.....  
Mauricio Benítez, Patrocinador

.....  
Mónica Insfrán, Patrocinador

## GESTIÓN DEL ALCANCE

La Estructura Desglosada del Trabajo (EDT) organiza el proyecto de alquileres de depósitos y bauleras “Self Storage” en cuatro componentes secuenciales, correspondientes a las cuatro etapas que atraviesa el emprendimiento desde la adquisición del terreno hasta la puesta en marcha comercial: Inmueble, Diseño-Licencias y Permisos, Construcción y Supervisión de Obra, y Administración del Proyecto.

Cada componente se desagrega hasta el nivel de paquete de trabajo, en el cual se identifican los productos concretos y verificables que deben entregarse, sin especificación aún de tiempos, costos ni responsables, conforme a los lineamientos del PMBOK (Project Management Institute, 2021).

La estructura jerárquica presentada constituye la base para la elaboración del cronograma y del presupuesto que se detallan en las secciones siguientes. La ejecución de los componentes responde a una lógica de dependencia estricta: el diseño y las gestiones municipales solo pueden avanzar una vez asegurado el inmueble, mientras que la construcción únicamente puede iniciarse después de la aprobación de los planos y de la obtención de las licencias correspondientes.

### **Componente N.º 1 – Inmueble**

El Componente N.º 1 comprende la identificación, la tasación y la adquisición de un terreno de 368 m<sup>2</sup> en la ciudad de Luque, apto para la implantación del complejo. Su producto es:

- **Producto 1:** Terreno adquirido.

### **Componente N.º 2 – Diseño, Licencias y Permisos**

El Componente N.º 2 agrupa dos frentes de gestión previos a la construcción. El primero corresponde a la elaboración del proyecto arquitectónico y de los diseños estructurales, a cargo de un Arquitecto y un Ingeniero Civil contratados para tal fin. El segundo corresponde a la tramitación, ante la Municipalidad de Luque, de las licencias comerciales y los permisos de construcción, bajo la responsabilidad de un Administrador contratado específicamente para esas gestiones. De este componente resultan dos productos:

- **Producto 2:** Depósito diseñado.
- **Producto 3:** Licencias comerciales y permisos municipales obtenidos.

### **Componente N.º 3 – Construcción y Supervisión de Obra**

El Componente N.º 3 comprende la ejecución física de la obra, a través de la contratación de una empresa constructora responsable de levantar el tinglado de 308 m<sup>2</sup> con sus bauleras internas divididas y equipadas, y de una fiscalización de obra independiente encargada de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los plazos y la calidad constructiva. Su producto es:

- **Producto 4:** Galpón con depósitos interiores divididos, construido y equipado.

### **Componente N.º 4 – Administración del Proyecto**

El Componente N.º 4 se extiende a lo largo de toda la vida del proyecto y comprende la contratación del equipo responsable de su gestión: un Coordinador de Proyecto, a cargo de la dirección técnica y administrativa en el terreno, y un Especialista Fiduciario, responsable del control financiero. Incluye, además, la contratación de una Auditoría Externa, cuya función

consiste en verificar, al cierre, el cumplimiento del objetivo y la correcta utilización de los recursos. Su producto es:

- **Producto5:** Equipo de proyecto contratado.

La organización de estos cuatro componentes en sus respectivos productos y paquetes de trabajo se representa gráficamente a continuación.



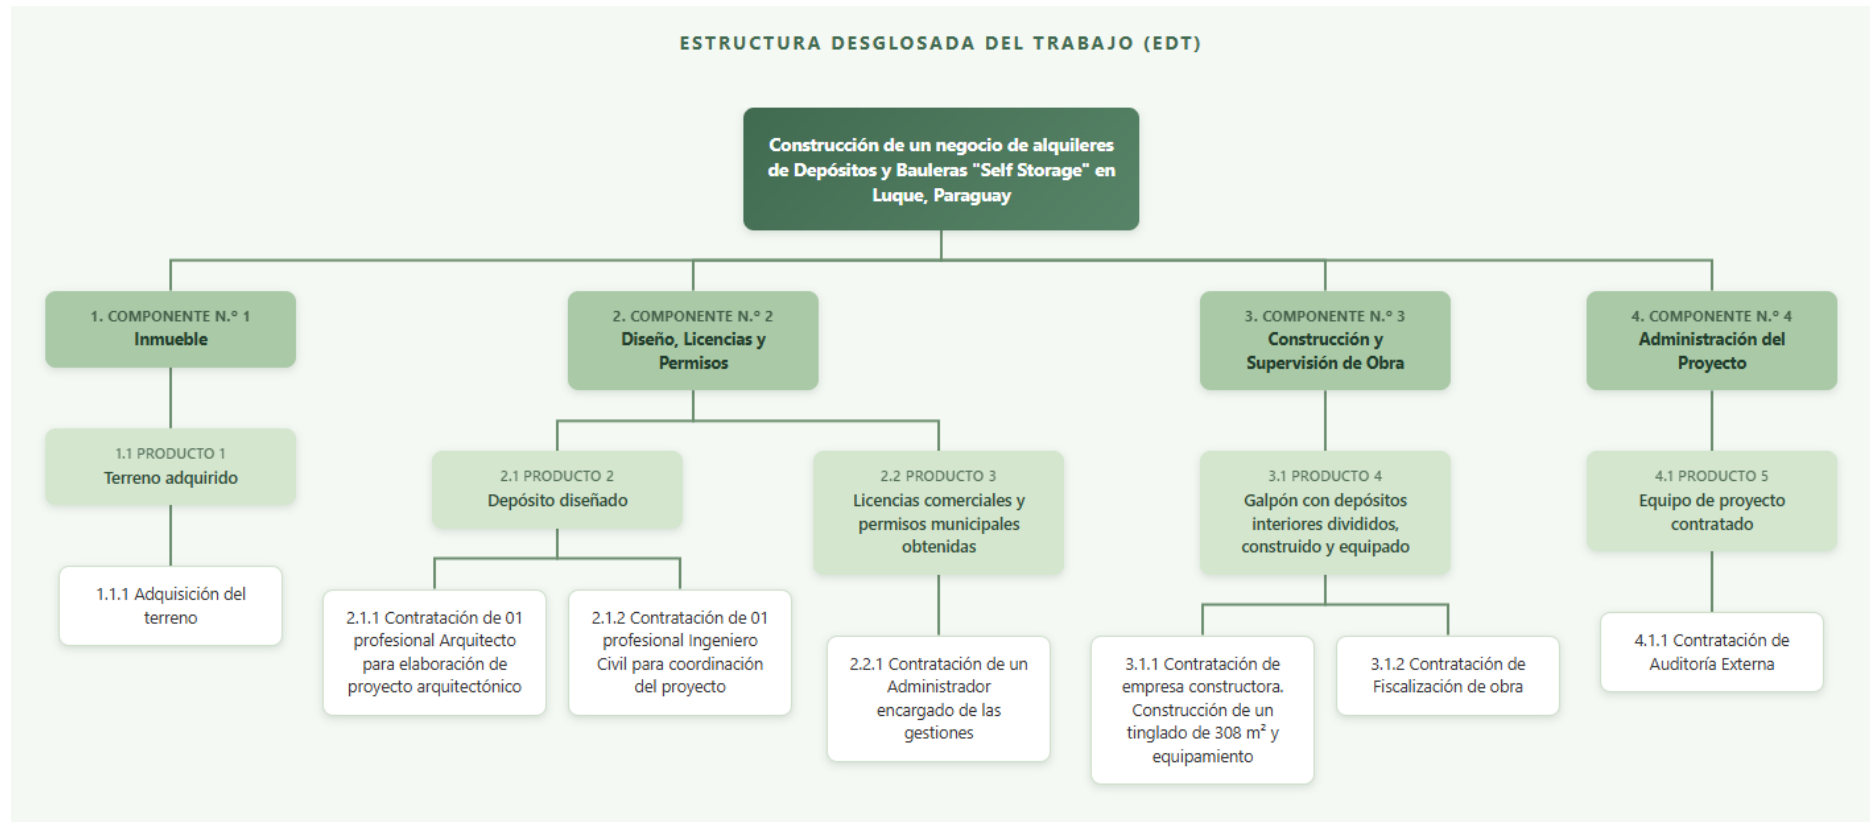
EDT<sup>1</sup>

GRÁFICO 2 EDT

<sup>1</sup> EDT: Estructura de desglose de trabajos. Fuente: elaboración propia.

## **GESTIÓN DEL TIEMPO**

La gestión del tiempo comprende la planificación, la programación, el seguimiento y el control de las actividades necesarias para que la adquisición del inmueble, el diseño, la construcción y la puesta en funcionamiento comercial del complejo se produzcan dentro de los plazos establecidos. La elaboración del cronograma constituye la traducción operativa del alcance definido para el proyecto, y su seguimiento periódico permite la identificación temprana de desviaciones respecto de la línea base, la comunicación del estado de avance a los interesados y la medición del desempeño real de la ejecución (Project Management Institute, 2021).

La puesta en marcha del cronograma se producirá a partir de la conformación del equipo de dirección definido en el Acta de Constitución del Proyecto, al que corresponde la elaboración de la línea base temporal, el seguimiento periódico de los avances reportados por cada componente y la incorporación de los ajustes que resulten necesarios para sostener el cumplimiento de los plazos comprometidos ante el Comité de Dirección.

La ejecución se iniciará el 1 de julio de 2027, y su finalización real, determinada por el cálculo de la ruta crítica, se producirá el 25 de mayo de 2028, a los 329 días corridos. Esta fecha no coincidirá con el hito administrativo de cierre del proyecto (25 de mayo de 2028), en la medida en que el desembolso correspondiente a la retención caucional y a la recepción definitiva de la obra se liberará diez días después de dicho hito. De esta divergencia se desprende que la finalización efectiva del proyecto quedará subordinada al proceso constructivo y no al proceso administrativo, circunstancia que debe incorporarse al establecimiento de la fecha de cierre de

la Auditoría Externa, programada actualmente con anterioridad a la liquidación del último pago de la obra.

### **Componente N.º 1 – Inmueble**

La adquisición del terreno de 368 m<sup>2</sup> constituye la condición de precedencia del proyecto en su conjunto, en la medida en que la habilitación de los componentes siguientes queda supeditada a la titularidad previa del inmueble. Por ese motivo, a este componente, con una duración de 65 días hábiles, le corresponde la totalidad de la ruta crítica en su tramo inicial, de modo que cualquier atraso registrado en su ejecución se traslada, sin margen de absorción, al inicio del componente siguiente.

- **Etapas de contratación:** 8 días, correspondientes al relevamiento de ofertas de terrenos disponibles en la zona.
- **Etapas de ejecución:** 50 días, correspondientes a la tasación de las opciones evaluadas y a la formalización del contrato de compraventa.
- **Calendario de pagos:** un pago de tasación y un pago final por el terreno y la escritura, por un total de Gs. 120.000.000.
- **Producto 1:** Terreno adquirido.

### **Componente N.º 2 – Diseño, Licencias y Permisos**

Una vez formalizada la escrituración del terreno, corresponde a este componente la elaboración del proyecto arquitectónico, la definición de los diseños estructurales y la tramitación, ante la Municipalidad de Luque, de las licencias comerciales y los permisos de construcción. De estos tres frentes, únicamente la elaboración del proyecto arquitectónico carece de holgura, en tanto condiciona tanto los diseños estructurales como la presentación de planos ante el municipio; la

tramitación de licencias, en cambio, dispone de margen suficiente para no constituirse en una restricción para el inicio de la obra.

- **Etapas de contratación:** entre 1 y 8 días, según el profesional o el proceso.
- **Etapas de ejecución:** entre 16 y 61 días, correspondiendo la mayor duración a la tramitación municipal.
- **Calendario de pagos:** en dos etapas, un anticipo al inicio del contrato y el saldo contra la entrega de lo contratado, tanto para el Arquitecto como para el Ingeniero Civil, además de tres pagos fraccionados correspondientes a la gestión administrativa municipal, por un total de Gs. 65.000.000.
- **Producto 2:** Depósito diseñado.
- **Producto 3:** Licencias comerciales y permisos municipales obtenidos.

### **Componente N.º 3 – Construcción y Supervisión de Obra**

Este componente concentra el 65 % del presupuesto total del proyecto, equivalente a Gs. 583.000.000, y representa el 46 % de la duración prevista, con una ejecución estimada de 150 días hábiles. Debido a la magnitud de los recursos financieros y del tiempo que demanda, su conclusión marca el cierre efectivo del proyecto. El último de los cuatro desembolsos previstos corresponde a la liberación de la retención de garantía durante la recepción definitiva de la obra, hecho que determina la fecha de finalización establecida en el cronograma.

- **Etapas de contratación:** 29 días, para la selección de la empresa constructora y de la fiscalización de obra.
- **Etapas de ejecución:** 91 días de obra civil y de equipamiento del tinglado de 308 m<sup>2</sup>.
- **Calendario de pagos:** Cuatro desembolsos según certificaciones de avance, por un total de Gs. 583.000.000.

- **Producto 4:** Galpón con depósitos interiores divididos, construido y equipado.

#### **Componente N.º 4 – Administración del Proyecto**

A diferencia de los tres componentes precedentes, cuya ejecución es secuencial, a este componente le corresponde un desarrollo paralelo a lo largo de toda la vida del proyecto. Su ejecución comprende la contratación del Coordinador de Proyecto y del Especialista Fiduciario, ambos incorporados durante la primera semana, el control de la utilización de los fondos aportados por los inversionistas y el seguimiento continuo del avance de los demás componentes durante los 228 días hábiles que dura el emprendimiento.


La contratación de la Auditoría Externa se ubica hacia el tramo final del proyecto; su fecha de cierre debe ajustarse de manera que su verificación comprenda el último desembolso correspondiente a la obra civil.

- **Etapas de contratación:** 6 días para el equipo de proyecto y 6 días adicionales para la Auditoría Externa.
- **Etapas de ejecución:** 307 días de gestión continua del equipo de proyecto y 20 días de trabajo de campo de la auditoría.
- **Calendario de pagos:** honorarios continuos del equipo de proyecto y un pago único a la Auditoría Externa, por un total de Gs. 132.900.000.
- **Producto 5:** Equipo de proyecto contratado.


El control del cronograma corresponderá al Coordinador del Proyecto, a quien competará la comparación periódica del avance físico registrado contra la línea base establecida y el reporte

de las desviaciones observadas sobre la ruta crítica en el informe quincenal previsto en el Acta de Constitución, conforme a las prácticas de control de cronograma descritas para proyectos de infraestructura con múltiples contratistas (Kerzner, 2017).

## CRONOGRAMA DEL PROYECTO<sup>2</sup>

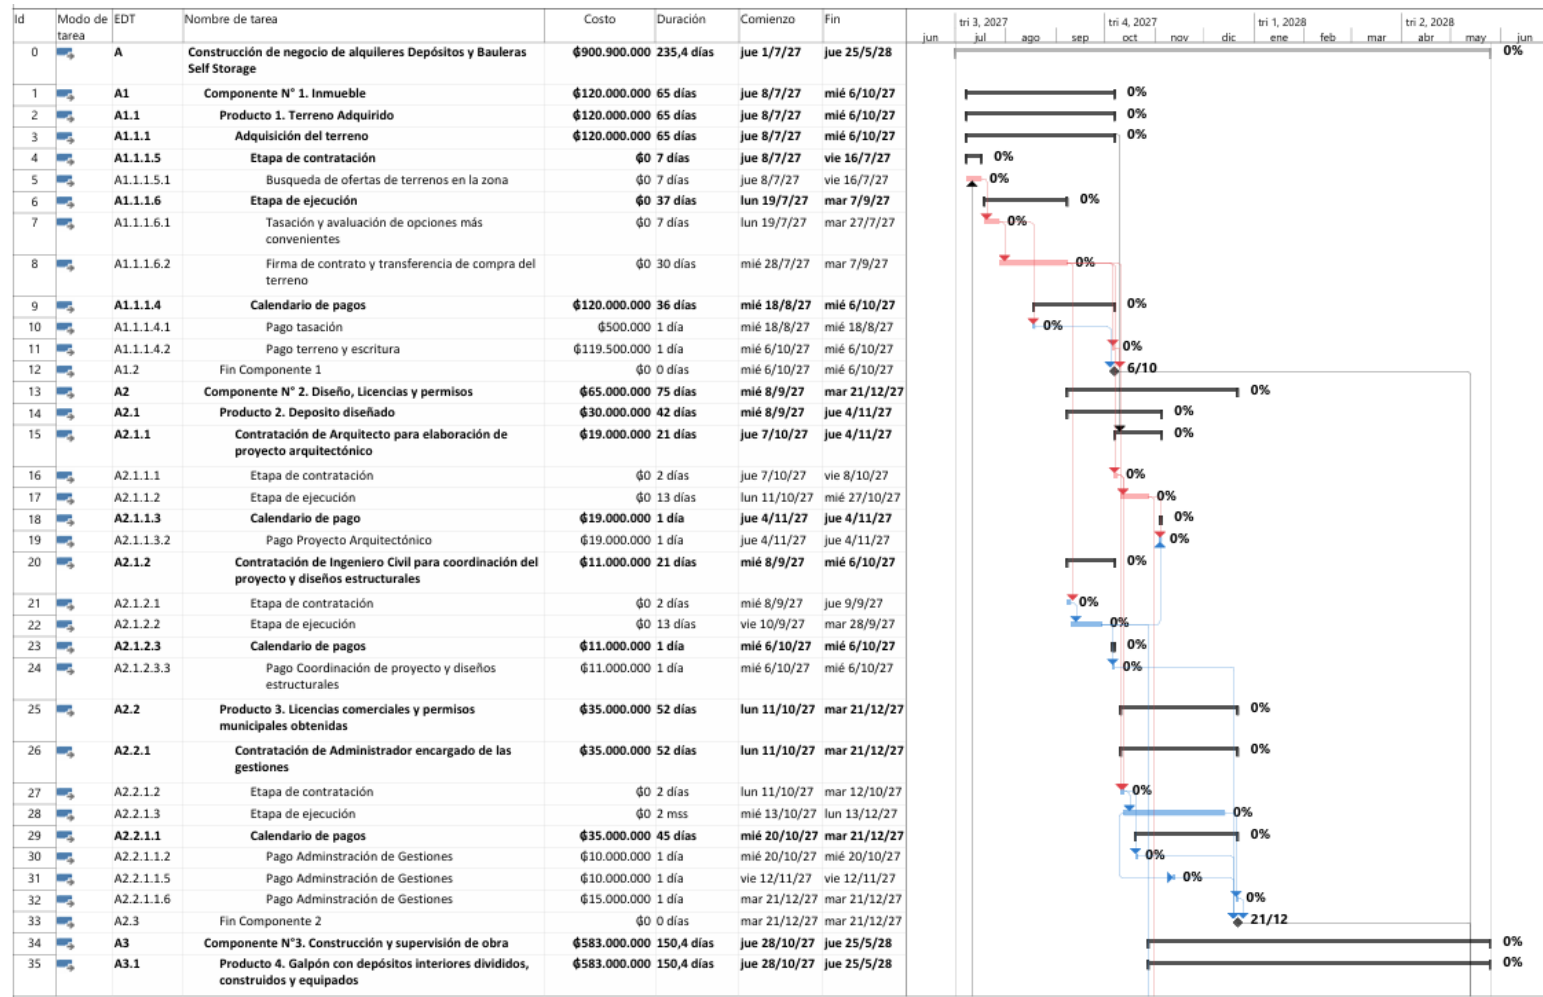

<sup>2</sup> El detalle completo de la Matriz de Gestión del Tiempo se encuentra como “ANEXO I – MATRIZ DE GESTIÓN DE TIEMPO” y “ANEXO II – DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO”.

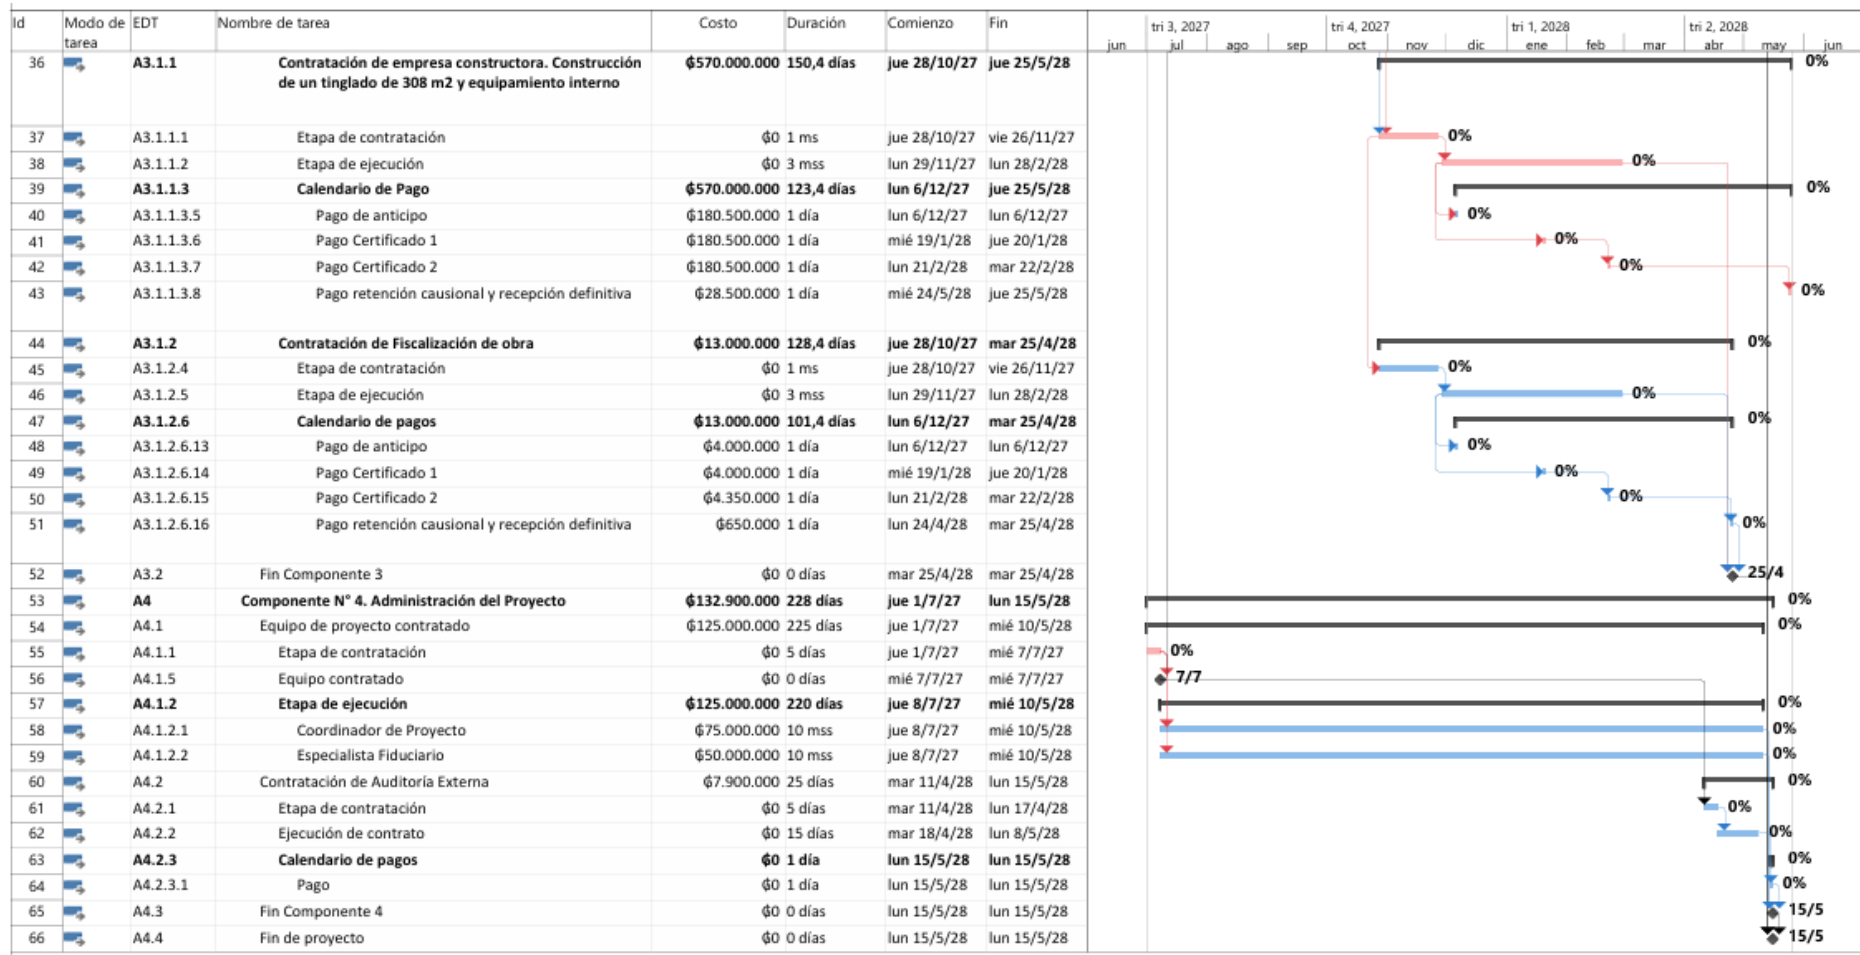



## **GESTIÓN DE COSTOS**

Antes del inicio de la ejecución, cada componente, producto y paquete de trabajo del proyecto recibió una valorización propia, con la que se conformó el presupuesto de Gs. 900.900.000 aprobado por los inversionistas para la construcción del complejo de depósitos y bauleras en la ciudad de Luque. La estimación y el posterior control de esos montos se ajustan a los criterios generales de gestión financiera de proyectos que plantea el Project Management Institute (2021), aplicados aquí sobre los contratos concretos de terreno, diseño, obra y administración que componen el proyecto.

Desde el inicio del proyecto se destinarán recursos a la contratación del Coordinador de Proyecto y del Especialista Fiduciario, cuyo honorario conjunto de Gs. 125.000.000 se abonará de manera mensual y permanecerá vigente desde la primera semana de ejecución hasta el cierre administrativo, previsto para mayo de 2028. A este monto se sumará, hacia el final del proyecto, el pago correspondiente a la Auditoría Externa, contratada específicamente para verificar el uso de los fondos una vez concluida la obra.

Durante el segundo semestre de 2027 se avanzará en el Producto 1, con el pago de la tasación del terreno en agosto (Gs. 500.000) y de la escritura definitiva en octubre (Gs. 119.500.000); en los Productos 2 y 3, con el pago único a los profesionales de diseño (Gs. 11.000.000 en octubre y Gs. 19.000.000 en noviembre) y los tres desembolsos fraccionados destinados a la gestión de licencias municipales (Gs. 10.000.000 en octubre, Gs. 10.000.000 en noviembre y Gs. 15.000.000 en diciembre); y con el inicio del Producto 4, cuyo primer desembolso, el anticipo entregado a la empresa constructora y a la fiscalización de obra, se concentrará en

diciembre por un total de Gs. 184.500.000. En este mismo tramo se abonarán además seis meses de honorarios del Producto 5, correspondientes al Coordinador de Proyecto y al Especialista Fiduciario, por un total de Gs. 75.000.000 (seis pagos mensuales de Gs. 12.500.000 cada uno, de julio a diciembre de 2027).

Durante el primer semestre de 2028 concluirá el Producto 4. Los certificados de avance de obra correspondientes a enero y febrero se liquidarán una vez verificado el cumplimiento físico de las etapas constructivas, mientras que las retenciones de garantía de la empresa fiscalizadora y de la empresa constructora se liberarán únicamente tras la recepción definitiva de la obra, prevista para abril y mayo, respectivamente. En ese mismo período finalizará también el Producto 5, con el pago de los últimos honorarios del equipo del proyecto y la cancelación única correspondiente a la Auditoría Externa, una vez presentado y aprobado su informe final.

**Tabla 1 RESUMEN DE COSTOS Y COMPONENTE**

| Estructura de la EDT |                     |                                    | Costo Estimado (G) |
|----------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1                    | <b>Componente 1</b> | Inmueble                           | 120.000.000        |
| 2                    | <b>Componente 2</b> | Diseño, Licencias y Permisos       | 65.000.000         |
| 3                    | <b>Componente 3</b> | Construcción y Supervisión de Obra | 583.000.000        |
| 4                    | <b>Componente 4</b> | Administración del Proyecto        | 132.900.000        |
| <b>Total (G)</b>     |                     |                                    | <b>900.900.000</b> |

**Observación:** El Cuadro de Costo Detallado, que desagrega el presupuesto hasta el nivel de cada pago individual según la codificación de la Estructura Desglosada del Trabajo, se presenta en el "ANEXO III – CUADRO DE COSTO DETALLADO".

El Cuadro de Flujo Proyectado, que reorganiza ese mismo presupuesto mes a mes entre julio de 2027 y mayo de 2028, se presenta en el "ANEXO IV – MATRIZ DE GESTIÓN DE COSTO".

En proyectos de construcción, la curva S es la representación gráfica del costo acumulado de la obra en función del tiempo transcurrido, y toma ese nombre por la forma característica que adopta su trazado: lenta al inicio, cuando el proyecto recién se está organizando y los desembolsos son menores; pronunciada en el tramo central, correspondiente al período de mayor actividad constructiva; y nuevamente lenta hacia el cierre, cuando ya no quedan más que los saldos de retención pendientes de liquidación (Pellicer, Yepes, Teixeira, Moura y Catalá, 2014). La Tabla 2 detalla el presupuesto por componente, producto y desembolso puntual, e identifica la fecha exacta prevista para la ejecución de cada pago.

### CURVA S

| Tabla 2 CURVA S                                                                                                    |                                            |                                        |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| "Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque - Paraguay" |                                            |                                        |                |             |
| Componente                                                                                                         | Producto                                   | Desembolso                             | Fecha          | Costo (€)   |
| Componente 1                                                                                                       | Producto 1: Terreno adquirido              | Pago de tasación                       | agosto-2027    | 500.000     |
|                                                                                                                    |                                            | Pago de terreno y escritura            | octubre-2027   | 119.500.000 |
| Subtotal Componente 1                                                                                              |                                            |                                        |                | 120.000.000 |
| Componente 2                                                                                                       | Producto 2: Depósito diseñado              | Pago a Ingeniero Civil                 | octubre-2027   | 11.000.000  |
|                                                                                                                    |                                            | Pago a Arquitecto                      | noviembre-2027 | 19.000.000  |
|                                                                                                                    | Producto 3: Licencias y permisos obtenidos | Pago 1 de 3, gestión municipal         | octubre-2027   | 10.000.000  |
|                                                                                                                    |                                            | Pago 2 de 3, gestión municipal         | noviembre-2027 | 10.000.000  |
|                                                                                                                    |                                            | Pago 3 de 3, gestión municipal         | diciembre-2027 | 15.000.000  |
| Subtotal Componente 2                                                                                              |                                            |                                        |                | 65.000.000  |
| Componente 3                                                                                                       | Producto 4: Galpón construido y equipado   | Anticipo a constructora                | diciembre-2027 | 180.500.000 |
|                                                                                                                    |                                            | Anticipo a fiscalización               | diciembre-2027 | 4.000.000   |
|                                                                                                                    |                                            | Certificado de avance 1, constructora  | enero-2028     | 180.500.000 |
|                                                                                                                    |                                            | Certificado de avance 1, fiscalización | enero-2028     | 4.000.000   |
|                                                                                                                    |                                            | Certificado de avance 2, constructora  | febrero-2028   | 180.500.000 |

| Tabla 2 CURVA S                                                                                                    |                                           |                                                                                        |                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| "Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque - Paraguay" |                                           |                                                                                        |                        |             |
| Componente                                                                                                         | Producto                                  | Desembolso                                                                             | Fecha                  | Costo (G)   |
|                                                                                                                    |                                           | Certificado de avance 2, fiscalización                                                 | febrero-2028           | 4.350.000   |
|                                                                                                                    |                                           | Retención caucional, fiscalización                                                     | abril-2028             | 650.000     |
|                                                                                                                    |                                           | Retención caucional, constructora                                                      | mayo-2028              | 28.500.000  |
| Subtotal Componente 3                                                                                              |                                           |                                                                                        |                        | 583.000.000 |
| Componente 4                                                                                                       | Producto 5: Equipo de proyecto contratado | Honorarios Coordinador y Especialista Fiduciario (11 pagos mensuales, jul-27 a may-28) | julio-2027 a mayo-2028 | 125.000.000 |
|                                                                                                                    |                                           | Pago a Auditoría Externa                                                               | mayo-2028              | 7.900.000   |
| Subtotal Componente 4                                                                                              |                                           |                                                                                        |                        | 132.900.000 |
| TOTAL PROYECTO                                                                                                     |                                           |                                                                                        |                        | 900.900.000 |


Los subtotales de la tabla muestran que el presupuesto no se distribuirá de manera uniforme entre los cuatro componentes del proyecto. El Componente 3 concentrará el 64,7% del monto total (Gs. 583.000.000), cifra prácticamente equivalente al doble de los recursos asignados en conjunto a los Componentes 1, 2 y 4 (Gs. 317.900.000).

Los desembolsos del Componente N.º 3, Construcción y Supervisión de Obra: corresponden a dos contratos independientes, la empresa constructora y la fiscalización de obra, cada uno con su propia secuencia de pago en tres etapas (anticipo, certificaciones de avance y retención de garantía). El contrato de la constructora, de Gs. 570.000.000, se liquida con un anticipo en diciembre de 2027, dos certificaciones de avance en enero y febrero de 2028, y una única retención de garantía, liberada en mayo de 2028 tras la recepción definitiva de la obra. El contrato de la fiscalización, de Gs. 13.000.000, sigue la misma secuencia de tres etapas, con su

propia retención liberada un mes antes, en abril de 2028, debido a que su función de control concluye antes que la obra civil en sí.

La distribución de los Componentes 1 y 2 seguirá una lógica distinta. El costo del terreno quedará cancelado hacia octubre de 2027 mediante dos desembolsos: la tasación, pagada en agosto, y la escritura, pagada en octubre. El diseño y las gestiones para la obtención de licencias se completarán, a su vez, entre octubre y diciembre del mismo año, a través de cinco pagos de menor cuantía equivalentes al 7,2% del presupuesto total; sumado al costo del terreno, ambos componentes representarán en conjunto el 20,6% del presupuesto.

El Componente 4 presentará una modalidad diferente de ejecución financiera, ya que sus pagos no dependen de hitos específicos, sino de una programación periódica: los honorarios del Coordinador del Proyecto y del Especialista Fiduciario se distribuirán en once pagos mensuales de igual periodicidad, desde julio de 2027 hasta mayo de 2028, a los que se incorporará un único desembolso destinado a la Auditoría Externa al finalizar el proyecto.

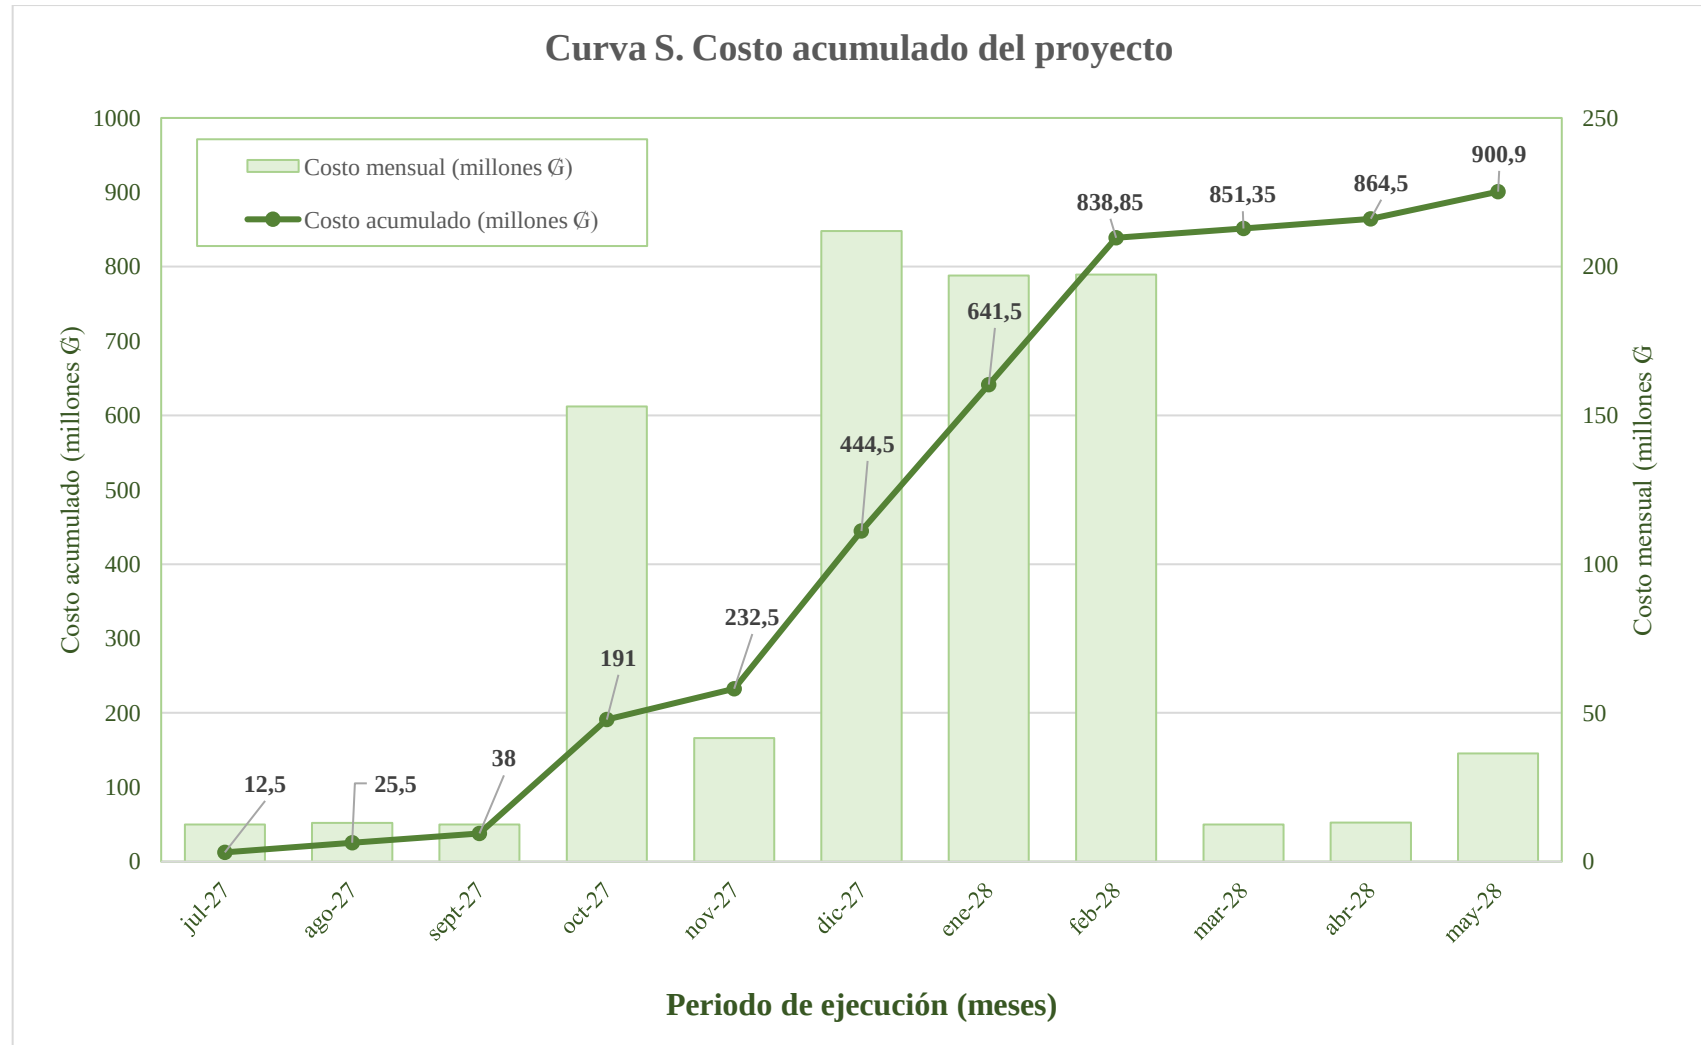

Fuente: elaboración propia

**GRÁFICO 3 CURVA S**

## **GESTIÓN DE ADQUISICIONES**

La gestión de adquisiciones reúne los procesos que permitirán al proyecto obtener, de proveedores externos, los bienes y servicios que no se producen con recursos propios: el inmueble, los servicios profesionales de diseño, la obra civil y los servicios de control financiero y auditoría (Project Management Institute, 2021). Se trata de un frente especialmente sensible en este proyecto, en la medida en que casi la totalidad del presupuesto de Gs. 900.900.000 se canalizará a través de contratos con terceros, por lo que la definición previa de a quién se contrata, bajo qué condiciones y contra qué hitos se libera cada pago resultará determinante para sostener tanto el cronograma como el presupuesto aprobado por los inversionistas (Gido, Clements y Baker, 2018).

Para este proyecto se aplicarán los tres procesos fundamentales de la gestión de adquisiciones: la planificación de qué se contratará y bajo qué modalidad, la ejecución de esas contrataciones propiamente dicha, y el control de que cada desembolso se corresponda con un avance verificado. Los cuatro componentes del proyecto demandarán, sin embargo, tipos de proveedor y esquemas de pago distintos entre sí, por lo que cada uno se describe de manera independiente a continuación.

### **Componente N.º 1 – Inmueble**

Para alcanzar el producto 1 referente al terreno de 368 m<sup>2</sup> requerido en la ciudad de Luque se obtendrá mediante la contratación de un servicio de asesoría inmobiliaria. Su selección se ordena en dos etapas: primero, la identificación y tasación de las alternativas que cumplan con la superficie requerida y con la zonificación municipal adecuada para uso comercial,

posteriormente la negociación de las condiciones de compra con el propietario de la opción elegida.

Una vez acordado el precio, se formalizará la escrituración ante escribanía, momento en el que se transferirá la titularidad del inmueble al proyecto.

Los pagos se liquidarán en dos desembolsos: uno correspondiente a la tasación (Gs. 500.000) y uno final, sensiblemente mayor, correspondiente al precio del terreno y a los gastos de escrituración (Gs. 119.500.000), por un total de Gs. 120.000.000 para todo el componente.

### **Componente N.º 2 – Diseño, Licencias y Permisos**

Para la ejecución de este componente será necesaria la formalización de dos tipos de contrato diferentes: dos servicios de consultoría profesional independientes entre sí, uno para un Arquitecto a cargo del proyecto arquitectónico y otro para un Ingeniero Civil a cargo de los diseños estructurales, y un servicio de gestión continuo a cargo de un Administrador dedicado exclusivamente a los trámites municipales. La selección de ambos profesionales se realizará en función de su trayectoria en proyectos de similar envergadura.

La ejecución del componente comprende, por un lado, la elaboración de los planos con sus respectivas validaciones técnicas, y por otro, la presentación de esos planos ante la Municipalidad de Luque para la obtención de la licencia comercial y los permisos de construcción; ambos contratos se cerrarán una vez que sus entregables queden aprobados por el Coordinador de Proyecto.

Los pagos se liquidarán de manera distinta según el proveedor: un pago único al Ingeniero Civil (Gs. 11.000.000) y otro al Arquitecto (Gs. 19.000.000), contra la entrega de sus respectivos productos, y tres pagos fraccionados al Administrador (Gs. 10.000.000, Gs.



10.000.000 y Gs. 15.000.000), asociados al avance progresivo de las gestiones municipales, por un total de Gs. 65.000.000 para todo el componente.

### **Componente N.º 3 – Construcción y Supervisión de Obra**

El galpón con sus bauleras internas se levantará mediante dos contratos que se adjudicarán en paralelo: una empresa constructora, responsable de la obra civil y del equipamiento, y una fiscalización de obra independiente, responsable de verificar que los avances declarados por la constructora se correspondan con la realidad antes de autorizar cada pago. Dada la magnitud del contrato (Gs. 583.000.000, el 65% del presupuesto total del proyecto), ambos proveedores se seleccionarán mediante un proceso comparativo de ofertas.

La ejecución comprende la construcción propiamente dicha, la instalación de los sistemas de seguridad y de control de acceso, y las inspecciones periódicas de la fiscalización a lo largo de toda la obra.

Ambos contratos comparten la misma estructura de pago, aunque con montos distintos: un anticipo inicial (Gs. 180.500.000 a la constructora y Gs. 4.000.000 a la fiscalización), dos certificados de avance de obra liquidados en enero y febrero (Gs. 180.500.000 y Gs. 4.000.000 cada uno, respectivamente), y una retención de garantía equivalente al 5% de cada contrato, liberada recién con la recepción definitiva de la obra (Gs. 28.500.000 a la constructora y Gs. 650.000 a la fiscalización).

### **Componente N.º 4 – Administración del Proyecto**

Este componente comenzará con la incorporación del equipo permanente del proyecto: un Coordinador de Proyecto, a cargo de la dirección técnica y administrativa, y un Especialista

Fiduciario, a cargo del control financiero, ambos seleccionados dentro de la primera semana de ejecución.

Su vínculo se extenderá de manera continua a lo largo de toda la vida del proyecto. Hacia el cierre, se sumará la contratación de una Auditoría Externa independiente, cuya selección deberá excluir a cualquier firma con vínculos previos con la constructora o la fiscalización de obra, de modo que su verificación final del uso de los fondos resulte efectivamente imparcial.

Los honorarios del Coordinador y del Especialista Fiduciario se liquidarán en once pagos mensuales que en conjunto sumarán Gs. 125.000.000, mientras que el contrato de la Auditoría Externa se liquidará en un pago único de Gs. 7.900.000, contra la presentación y la aprobación de su informe final.

A continuación, se presenta la Matriz de Adquisiciones.

## MATRIZ DE ADQUISICIONES

**Tabla 3 MATRIZ DE ADQUISICIONES**

|                  |                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque - Paraguay |
| <b>ID:</b>       | PROY-STO-2026-001                                                                                                |

| Código EDT | Estructura de la EDT                                                                   | Tipo de Adquisición               | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |            | Presupuesto Estimado |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------|----------------------|
|            |                                                                                        |                                   |                          | Inicio           | Fin        |                      |
| A1         | Componente N° 1. Inmueble                                                              |                                   |                          | 08/07/2027       | 06/10/2027 | ₡ 120.000.000        |
| A1.1       | Producto 1. Terreno Adquirido                                                          | Servicio de asesoría inmobiliaria | Comparación de precios   | 08/07/2027       | 06/10/2027 | ₡ 120.000.000        |
| A1.1.1     | Adquisición del terreno                                                                | Servicio de asesoría inmobiliaria | Comparación de precios   | 08/07/2027       | 06/10/2027 | ₡ 120.000.000        |
| A2         | Componente N° 2. Diseño, Licencias y permisos                                          |                                   |                          | 08/09/2027       | 21/12/2027 | ₡ 65.000.000         |
| A2.1       | Producto 2. Depósito diseñado                                                          | Servicios Consultoría Individual  | Terna competitiva        | 08/09/2027       | 04/11/2027 | ₡ 30.000.000         |
| A2.1.1     | Contratación de Arquitecto para elaboración de proyecto arquitectónico                 | Servicios Consultoría Individual  | Terna competitiva        | 07/10/2027       | 04/11/2027 | ₡ 19.000.000         |
| A2.1.2     | Contratación de Ingeniero Civil para coordinación del proyecto y diseños estructurales | Servicios Consultoría Individual  | Terna competitiva        | 08/09/2027       | 06/10/2027 | ₡ 11.000.000         |

| Código EDT | Estructura de la EDT                                                                               | Tipo de Adquisición                      | Modalidad de Adquisición                   | Fechas Estimadas |            | Presupuesto Estimado |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|
|            |                                                                                                    |                                          |                                            | Inicio           | Fin        |                      |
| A2.2       | Producto 3. Licencias comerciales y permisos municipales obtenidas                                 | Servicio de gestión                      | Contratación Directa                       | 11/10/2027       | 21/12/2027 | ₡ 35.000.000         |
| A2.2.1     | Contratación de Administrador encargado de las gestiones                                           | Servicio de gestión                      | Contratación Directa                       | 11/10/2027       | 21/12/2027 | ₡ 35.000.000         |
| A3         | Componente N°3. Construcción y supervisión de obra                                                 |                                          |                                            | 28/10/2027       | 25/05/2028 | ₡ 583.000.000        |
| A3.1       | Producto 4. Galpón con depósitos interiores divididos, construidos y equipados                     | Servicios (construcción y fiscalización) | Comparación de precios y Terna competitiva | 28/10/2027       | 25/05/2028 | ₡ 583.000.000        |
| A3.1.1     | Contratación de empresa constructora. Construcción de un tinglado de 308 m2 y equipamiento interno | Servicio de contratista                  | Comparación de precios                     | 28/10/2027       | 25/05/2028 | ₡ 570.000.000        |
| A3.1.2     | Contratación de Fiscalización de obra                                                              | Servicios Consultoría Individual         | Terna competitiva                          | 28/10/2027       | 25/04/2028 | ₡ 13.000.000         |
| A4         | Componente N° 4. Administración del Proyecto                                                       |                                          |                                            | 01/07/2027       | 25/05/2028 | ₡ 132.900.000        |
| A4.1       | Equipo de proyecto contratado (Coordinador de Proyecto y Especialista Fiduciario)                  | Servicios Consultoría Individual         | Contratación Directa                       | 01/07/2027       | 10/05/2028 | ₡ 125.000.000        |
| A4.2       | Contratación de Auditoría Externa                                                                  | Servicios Consultoría Individual         | Terna competitiva                          | 11/04/2028       | 25/05/2028 | ₡ 7.900.000          |
| Total      |                                                                                                    |                                          |                                            |                  |            | ₡ 900.900.000        |

## **GESTIÓN DE RIESGOS**

La gestión de riesgos comprende la identificación, el análisis, la planificación de respuestas y el monitoreo continuo de los eventos que puedan comprometer el alcance, el plazo o el presupuesto del proyecto. Dado que el proyecto de alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” requerirá una secuencia de contrataciones con relaciones de dependencia entre sí (el terreno condiciona el diseño, y este condiciona a su vez el inicio de la obra), un atraso en cualquiera de estas actividades se trasladaría, sin margen de absorción, al resto del cronograma.

La Matriz de Identificación y Análisis de Riesgos elaborada para el proyecto agrupa los eventos previstos en tres categorías: riesgos de planificación, vinculados a la contratación de los proveedores clave; un riesgo de origen natural, asociado a las condiciones climáticas durante la obra; y un riesgo económico y financiero, asociado a la variación de costos. La categoría de planificación concentra la mayor cantidad de eventos identificados, en la medida en que cada componente del proyecto depende de la contratación oportuna de un profesional o de una empresa específica.

Dentro de esta categoría, el riesgo de mayor magnitud calculada corresponde a una eventual demora en la contratación del Ingeniero Civil, cuyos diseños estructurales condicionarán tanto la validación del proyecto arquitectónico como la presentación de los planos ante la Municipalidad de Luque; su ausencia paralizaría, en consecuencia, las aprobaciones posteriores. Con una magnitud levemente inferior se identifican el riesgo de una demora en la selección del terreno, que obligaría a evaluar una alternativa en otra zona, con un costo mayor y con al menos un mes de atraso adicional, y el riesgo de una demora en la contratación del Arquitecto. Los riesgos de demora en la contratación del Administrador de gestiones y de la empresa constructora presentan una magnitud calculada menor, en tanto su impacto quedaría acotado a un componente puntual, sin comprometer de igual manera al resto del cronograma.

Los plazos de atraso estimados para los riesgos de planificación se derivan de las duraciones previstas en el propio cronograma del proyecto. En el caso del terreno, el mes de atraso corresponde al tiempo que insumiría reiniciar la búsqueda y una nueva tasación, equivalente a la duración estimada para ese proceso en el Componente N.º 1. Para el Arquitecto y el Administrador, los dos meses reflejan el tiempo necesario para repetir su contratación y recomponer el encadenamiento de tareas del Componente N.º 2. Como la Estructura Desglosada del Trabajo no prevé holgura entre estas contrataciones sucesivas, los eventos que condicionan a varias tareas posteriores, como la contratación del Ingeniero Civil, alcanzan una magnitud de riesgo mayor que los de impacto acotado a un único componente.

El riesgo de origen natural corresponde a las condiciones climáticas previstas durante la ejecución de la obra civil. De acuerdo con el registro histórico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), la ciudad de Luque acumula entre 113 y 197 mm de lluvia mensual, concentrados principalmente en octubre, noviembre y abril, meses que coincidirán con el tramo de mayor actividad constructiva del Componente N.º 3. De materializarse precipitaciones intensas durante ese período, las tareas al aire libre podrían detenerse de manera parcial o total, con un atraso estimado de entre 30 y 60 días en la entrega de la obra.

El riesgo económico y financiero, por último, corresponde a una eventual variación en el costo de los materiales de construcción, como el cemento y el hierro, o de los honorarios de la mano de obra, que podría encarecer la obra hasta en un 20%. Si bien los mecanismos formales de reajuste de precios previstos en la Ley N° 7021/2022 y en su antecesora, la Ley N° 4.678/2013, ya derogada, rigen exclusivamente contratos con el Estado paraguayo, la fórmula técnica que ambas establecieron para vincular el reajuste al índice de precios del cemento publicado por el Banco Central del Paraguay suele tomarse como parámetro de referencia también en contratos privados de construcción, frente a la inflación o a la volatilidad cambiaria. A continuación, se presentan la Matriz de Gestión de Riesgos y Plan de Respuesta:

## MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS

Se detallan a continuación los riesgos relevados para el proyecto, junto con la valoración cualitativa de su probabilidad de ocurrencia, su impacto potencial y el nivel de riesgo que resulta de combinar ambos factores.

**Tabla 4 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS**

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del proyecto:</b>    | <b>Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque - Paraguay</b> |
| <b>Fecha de actualización:</b> | <b>24/05/2026</b>                                                                                                       |

| Registro de riesgos |                      |                                  |                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                           | Análisis cualitativo de riesgos                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |                 |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| ID Riesgo           | Taxonomía del riesgo | Productos o resultados afectados | Causa                                                                                                            | Evento                                                                            | Impacto                                                                                                                                   | Factor de probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                            | Nivel de probabilidad | Nivel de impacto | Nivel de riesgo |
| 1                   | Planificación        | Producto 1: Terreno adquirido    | Si el proceso de tasación no encuentra una oferta de terreno que cumpla los requisitos dentro del plazo previsto | Se vería necesario ampliar la búsqueda a otra zona de Luque o localidades vecinas | Lo que ocasionaría un atraso de <b>al menos 37 días hábiles (aproximadamente 1.7 meses calendario)</b> y un costo de adquisición más alto | Probabilidad 30% – En proyectos inmobiliarios similares en la ciudad de Luque, la transferencia de inmuebles demoró entre 30 y 45 días hábiles por trámites notariales y registrales, lo que justifica la probabilidad de que el proceso se extienda más allá del plazo previsto. | 2                     | 4                | 8               |

| Registro de riesgos |                      |                                  |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                      | Análisis cualitativo de riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                  |                 |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| ID Riesgo           | Taxonomía del riesgo | Productos o resultados afectados | Causa                                                                                                     | Evento                                                                                                 | Impacto                                                                                                              | Factor de probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nivel de probabilidad | Nivel de impacto | Nivel de riesgo |
| 2                   | Planificación        | Producto 2: Depósito diseñado    | Si el Arquitecto seleccionado no queda contratado dentro del plazo estimado                               | El proyecto arquitectónico no avanzaría y no habría planos disponibles para iniciar la siguiente etapa | Lo que ocasionaría un atraso de al menos <b>dos meses</b> en el inicio de obra                                       | Probabilidad 40% – En antecedentes de contratación de arquitectos para proyectos de depósitos y obras civiles en Central, se registraron demoras de hasta dos meses debido a disponibilidad limitada de profesionales y ajustes en honorarios, lo que justifica la probabilidad de no contar con el profesional a tiempo. | 2                     | 4                | 8               |
| 3                   | Planificación        | Producto 2: Depósito diseñado    | Si el Ingeniero Civil no queda contratado a tiempo para coordinar el proyecto y los diseños estructurales | Las aprobaciones técnicas y la validación de la documentación quedarían sin responsable                | Lo que ocasionaría un atraso de al menos <b>un mes</b> , con paralización en cascada de las aprobaciones posteriores | Probabilidad 60% – En antecedentes de coordinación técnica en proyectos de depósitos y obras civiles en Central, la contratación de ingenieros civiles se retrasó por disponibilidad limitada y validación de documentación, lo que justifica la alta probabilidad de no conseguir la contratación a tiempo.              | 3                     | 4                | 12              |



| Registro de riesgos |                      |                                                                    |                                                                                             |                                                                                    |                                                           | Análisis cualitativo de riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |                 |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| ID Riesgo           | Taxonomía del riesgo | Productos o resultados afectados                                   | Causa                                                                                       | Evento                                                                             | Impacto                                                   | Factor de probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nivel de probabilidad | Nivel de impacto | Nivel de riesgo |
| 4                   | Planificación        | Producto 3: Licencias comerciales y permisos municipales obtenidas | Si no se logra incorporar a tiempo un Administrador con experiencia en trámites municipales | Los expedientes de licencias y permisos no avanzarían en la Municipalidad de Luque | Lo que ocasionaría un atraso de al menos <b>dos meses</b> | Probabilidad 20% – En trámites municipales de la Gran Asunción, la sobrecarga administrativa y la falta de personal en las oficinas de habilitación han generado demoras de hasta 2 meses, lo que reduce la disponibilidad de profesionales con experiencia para gestionar estos expedientes, justificando la probabilidad baja de encontrar un administrador disponible a tiempo. | 1                     | 5                | 5               |
| 5                   | Planificación        | Producto 4: Galpón construido y equipado                           | Si el proceso de selección de la empresa constructora se extiende más de lo previsto        | La fecha real de inicio de obra quedaría desplazada respecto del cronograma        | Lo que ocasionaría un atraso de al menos <b>un mes</b>    | Probabilidad 20% – En proyectos de construcción de tinglados metálicos en Paraguay, los procesos de licitación y negociación de precios con las empresas contratistas suelen extenderse más de lo previsto, lo que justifica la probabilidad de que el proceso de selección demande más tiempo del planificado.                                                                    | 1                     | 4                | 4               |

| Registro de riesgos |                        |                                          |                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                              | Análisis cualitativo de riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                 |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| ID Riesgo           | Taxonomía del riesgo   | Productos o resultados afectados         | Causa                                                                                                                    | Evento                                                                                                  | Impacto                                                                      | Factor de probabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nivel de probabilidad | Nivel de impacto | Nivel de riesgo |
| 6                   | Natural                | Producto 4: Galpón construido y equipado | Si se registran lluvias intensas durante los meses de mayor actividad constructiva                                       | Las tareas al aire libre deberían detenerse de forma parcial o total                                    | Lo que ocasionaría un atraso de <b>30 a 60 días</b> en la entrega de la obra | Probabilidad 60% – En registros históricos de obras civiles en Central, las lluvias intensas durante los meses de mayor actividad constructiva han sido un factor recurrente, justificando la alta probabilidad de que se repitan y afecten el cronograma de la obra.                                                                          | 3                     | 4                | 12              |
| 7                   | Económico y Financiero | Producto 4: Galpón construido y equipado | Si el precio de insumos como el cemento y el hierro, o el costo de la mano de obra, varía por encima de lo presupuestado | Se produciría un desabastecimiento de materiales o un ajuste del salario mínimo que encarecería la obra | Lo que ocasionaría un incremento del costo de obra de hasta el <b>20%</b>    | Probabilidad 60% – En antecedentes recientes de obras metálicas en Paraguay, la volatilidad del precio del cemento y del hierro, así como los ajustes en el salario mínimo, han generado incrementos de costos de hasta el 20% en proyectos similares, lo que justifica la alta probabilidad de que este riesgo se materialice en el proyecto. | 3                     | 4                | 12              |

## PLAN DE RESPUESTA

A partir de los eventos relevados en la matriz anterior, se establece para cada uno una estrategia de tratamiento, la acción concreta que la pone en práctica, el responsable de ejecutarla y el momento o la condición que activa su implementación.

**Tabla 5 PLAN DE RESPUESTA**

| Nombre del proyecto:    |  | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque - Paraguay |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Fecha de actualización: |  | 24/05/2026                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |

| Registro de riesgos |                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                             | Análisis cualitativo | Plan de respuesta       |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ID Riesgo           | Causa                                                                                                                            | Evento                                                              | Impacto                                                                                                                     | Nivel de riesgo      | Estrategia de respuesta | Acción de respuesta                                                                                                                                                                                                               | Responsable             | Disparador de la respuesta o fecha oportuna de la implementación               |
| 1                   | Si ninguna de las opciones de terreno relevadas cumple con los requisitos de superficie y zonificación dentro del plazo previsto | La búsqueda debería extenderse a otras localidades cercanas a Luque | Lo que ocasionaría que el arranque del proyecto se postergue al menos un mes y que el terreno adquirido resulte más costoso | 8                    | Mitigar                 | Contratar un asesor inmobiliario que amplíe y agilice el relevamiento de opciones disponibles                                                                                                                                     | Coordinador de Proyecto | A los 30 días desde el inicio de la búsqueda de ofertas de terrenos en la zona |
| 2                   | Si la contratación del Arquitecto no se concreta dentro del plazo estimado                                                       | El proyecto arquitectónico quedaría sin avanzar por falta de planos | Lo que ocasionaría un atraso mínimo de dos meses en el inicio de obra                                                       | 8                    | Mitigar                 | Iniciar el llamado a terna con 30 días de anticipación respecto de la fecha prevista en el cronograma y preseleccionar un oferente alternativo, de modo que el desistimiento del primer candidato no obligue a reabrir el proceso | Coordinador de Proyecto | A los 15 días del llamado sin ofertas válidas recibidas                        |
| 3                   | Si el Ingeniero Civil encargado de                                                                                               | Las validaciones técnicas y la                                      | Lo que ocasionaría un atraso mínimo de                                                                                      | 12                   | Evitar                  | Adjudicar la contratación del Ingeniero Civil en el mismo                                                                                                                                                                         | Coordinador de Proyecto | Al momento de lanzar el proceso de                                             |

| Registro de riesgos |                                                                                                          |                                                                                          |                                                                              | Análisis cualitativo | Plan de respuesta       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ID Riesgo           | Causa                                                                                                    | Evento                                                                                   | Impacto                                                                      | Nivel de riesgo      | Estrategia de respuesta | Acción de respuesta                                                                                                                                                                                                                                          | Responsable             | Disparador de la respuesta o fecha oportuna de la implementación              |
|                     | coordinar el proyecto y los diseños estructurales no queda incorporado a tiempo                          | documentación de diseño quedarían sin un responsable a cargo                             | un mes y la paralización en cascada de las aprobaciones posteriores          |                      |                         | proceso que la del Arquitecto e incorporar en el contrato una cláusula de disponibilidad para las validaciones estructurales, de manera que el diseño no quede supeditado a una contratación posterior                                                       |                         | contratación del Componente N.º 2                                             |
| 4                   | Si no se consigue incorporar a tiempo un Administrador con experiencia en trámites ante la Municipalidad | Los expedientes de licencias y permisos quedarían detenidos en la Municipalidad de Luque | Lo que ocasionaría un atraso acumulado de al menos dos meses                 | 4                    | Mitigar                 | Asignar de forma transitoria la presentación de expedientes al Gestor Administrativo del Equipo Comercial y Legal hasta completar la incorporación definitiva, de modo que el avance de los trámites municipales no quede supeditado a una sola contratación | Coordinador de Proyecto | A los 15 días de iniciada la etapa de contratación sin postulantes idóneos    |
| 5                   | Si la selección de la empresa constructora demanda más tiempo del previsto en el cronograma              | La fecha efectiva de inicio de obra se desplazaría respecto de lo planificado            | Lo que ocasionaría un atraso de al menos un mes                              | 4                    | Mitigar                 | Convocar a terna con pliego de condiciones cerrado y plazo acotado de recepción de ofertas, y mantener un oferente suplente en condiciones de ser adjudicado ante el desistimiento del primero                                                               | Coordinador de Proyecto | A los 15 días desde el inicio de la etapa de contratación sin ofertas válidas |
| 6                   | Si los meses de mayor actividad constructiva coinciden con el período de lluvias más intensas de la zona | Las tareas al aire libre se verían interrumpidas de forma parcial o total                | Lo que ocasionaría un retraso de entre 30 y 60 días en la entrega de la obra | 12                   | Transferir              | Pactar con la empresa constructora el plazo de ejecución, establecer multas por atraso y exigir garantía de cumplimiento de contrato y de plan de trabajo                                                                                                    | Fiscalización de Obra   | Desde el inicio de la etapa de ejecución de la obra                           |
| 7                   | Si el costo de insumos clave, como el cemento y                                                          | Se presentaría desabastecimiento de materiales o un                                      | Lo que ocasionaría un incremento del                                         | 12                   | Mitigar                 | Pactar en el contrato un porcentaje máximo de sobre costo de obra de hasta el 20% y exigir                                                                                                                                                                   | Especialista Fiduciario | Desde el inicio de la etapa de ejecución de la obra                           |

| Registro de riesgos |                                                               |                           |                                        | Análisis cualitativo | Plan de respuesta       |                                     |             |                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ID Riesgo           | Causa                                                         | Evento                    | Impacto                                | Nivel de riesgo      | Estrategia de respuesta | Acción de respuesta                 | Responsable | Disparador de la respuesta o fecha oportuna de la implementación |
|                     | el hierro, o de la mano de obra se aparta de lo presupuestado | ajuste del salario mínimo | costo total de la obra de hasta el 20% |                      |                         | garantía de mantenimiento de oferta |             |                                                                  |

## **GESTIÓN DE LOS INTERESADOS**

La gestión de los interesados comprende la identificación de las personas, los grupos y las organizaciones cuyos intereses pueden verse afectados por la ejecución del proyecto o por sus resultados, así como el análisis de su capacidad de influir sobre ese desarrollo; Freeman (1984) definió a los interesados como cualquier grupo o individuo capaz de afectar o de ser afectado por el logro de los objetivos de una organización.

Para el proyecto se identificaron once interesados: el Promotor Desarrollador Inmobiliario, los inversores y bancos financiadores, el equipo técnico de diseño y obra, el Auditor Externo, el futuro equipo de operaciones, las autoridades municipales, los clientes finales y los vecinos del entorno. A cada uno se le asignó un nivel de interés, un nivel de influencia, un origen (interno o externo) y una posición frente al proyecto, ya sea partidaria, neutral o reticente.

De esa combinación de interés e influencia se desprende la estrategia aplicable a cada cuadrante. Interés e influencia bajos requieren solo monitoreo, como en el caso de los vecinos del entorno. Interés alto con influencia baja exige mantener informado, situación del Auditor Externo. Influencia alta con interés bajo demanda mantener satisfecho, como ocurre con el futuro equipo de operaciones. Ambos factores altos, como en el Promotor y los inversores, requieren una gestión cercana y permanente.

Las estrategias definidas a partir de esta clasificación buscan sostener el apoyo de los interesados favorables y reducir el impacto de los neutrales o reticentes: participación temprana

en las mesas técnicas de diseño, reportes periódicos de avance y canales de comunicación directa para resolver reclamos.

A continuación, se presentan la Matriz de Interesados y las matrices individuales de cada uno de los once interesados identificados.

## MATRIZ DE INTERESADOS

**Tabla 6 MATRIZ DE STAKEHOLDER**

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b>        | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay |
| <b>Código:</b>          | PROY-STO-2026-001                                                                                               |
| <b>Fecha de Inicio:</b> | 01/07/2027                                                                                                      |

| Interesado                           | Cargo                                     | Rol en el Proyecto                      | Nivel de Interés        | Nivel de Influencia     | Requisitos                                                                                                                      | Expectativas                                                                                                                           | Clasificación       |                                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                      |                                           | Interesado/<br>Cliente/<br>Patrocinante | Alto/<br>Medio/<br>Bajo | Alto/<br>Medio/<br>Bajo |                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | Interno/<br>Externo | Partidario/<br>Neutral/<br>Reticente |
| Mauricio Benítez<br>/ Mónica Insfrán | Promotor<br>Desarrollador<br>Inmobiliario | Beneficiario/<br>Patrocinante           | Alto                    | Alto                    | Entrega en el plazo estipulado,<br>cumplimiento estricto del presupuesto<br>maestro y estándares de calidad<br>constructiva     | Optimización del área<br>alquilable, flexibilidad<br>arquitectónica futura y<br>posicionamiento de<br>marca de alto valor<br>percibido | Interno             | Partidario                           |
| Banco /<br>Entidades<br>Financieras  | Inversores                                | Patrocinante                            | Alto                    | Alto                    | Garantías hipotecarias inscritas,<br>certificaciones de avance físico<br>validadas y uso de fondos en los<br>rubros autorizados | Ritmo de obra conforme<br>al cronograma y<br>transparencia en los<br>estados financieros<br>auditados                                  | Externo             | Partidario                           |
| Arquitecto                           | Equipo de<br>proyecto                     | Beneficiario                            | Alto                    | Alto                    | Programa de necesidades claro,<br>información técnica de base y<br>coordinación oportuna con las demás<br>especialidades        | Respeto a la autoría del<br>diseño y pago puntual<br>de honorarios contra<br>hitos de entrega                                          | Interno             | Partidario                           |
| Ingeniero Civil                      | Equipo de<br>proyecto                     | Beneficiario                            | Alto                    | Alto                    | Compatibilización de todas las<br>ingenierías con la arquitectura y<br>especificaciones técnicas detalladas                     | Autoridad para liderar<br>las revisiones técnicas y<br>herramientas adecuadas<br>de coordinación                                       | Interno             | Partidario                           |



| Interesado                            | Cargo          | Rol en el Proyecto                      | Nivel de Interés        | Nivel de Influencia     | Requisitos                                                                                                      | Expectativas                                                                                          | Clasificación       |                                      |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                       |                | Interesado/<br>Cliente/<br>Patrocinante | Alto/<br>Medio/<br>Bajo | Alto/<br>Medio/<br>Bajo |                                                                                                                 |                                                                                                       | Interno/<br>Externo | Partidario/<br>Neutral/<br>Reticente |
| Empresa Constructora                  | Ejecutor       | Beneficiario                            | Alto                    | Alto                    | Planos ejecutivos liberados, pagos puntuales de anticipo y certificaciones, y acceso acondicionado al terreno   | Reconocimiento contractual de imprevistos de suelo o clima y colaboración fluida con la fiscalización | Interno             | Partidario                           |
| Fiscal de Obras                       | Contralor      | Beneficiario                            | Alto                    | Alto                    | Autoridad para aprobar o detener trabajos, acceso a ensayos de materiales y bitácora de obra oficializada       | Mínima presión para aprobar trabajos de calidad dudosa y estándar riguroso de seguridad en obra       | Interno             | Partidario                           |
| Auditor Externo                       | Contralor      | Beneficiario                            | Alto                    | Bajo                    | Acceso irrestricto a la documentación de soporte y trazabilidad del flujo de caja del proyecto                  | Sistema de control interno sólido y colaboración proactiva para cerrar observaciones de auditoría     | Externo             | Neutro                               |
| Futuro Equipo de Operaciones          | Operador       | Beneficiario                            | Bajo                    | Alto                    | Diseño modular eficiente, materiales de bajo mantenimiento y zona de carga y descarga adecuada                  | Manual de operaciones claro y garantías extendidas en sistemas de acceso y techado                    | Interno             | Partidario                           |
| Autoridades Municipales y Reguladores | Ente Regulador | Beneficiario                            | Alto                    | Alto                    | Cumplimiento del plan regulador, aprobación del proyecto contra incendios y Estudio de Impacto Ambiental y Vial | Aporte estético a la zona y agilidad en la presentación de planos conforme a obra                     | Externo             | Neutro                               |
| Los Clientes Finales                  | Usuarios       | Cliente                                 | Alto                    | Medio                   | Estanqueidad de las unidades, control de acceso individual y pasillos accesibles con carretillas disponibles    | Opción de control climático, contratación 100% digital y percepción de seguridad en el complejo       | Externo             | Partidario                           |

| Interesado                | Cargo                | Rol en el Proyecto                      | Nivel de Interés        | Nivel de Influencia     | Requisitos                                                                              | Expectativas                                                                     | Clasificación       |                                      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                           |                      | Interesado/<br>Cliente/<br>Patrocinante | Alto/<br>Medio/<br>Bajo | Alto/<br>Medio/<br>Bajo |                                                                                         |                                                                                  | Interno/<br>Externo | Partidario/<br>Neutral/<br>Reticente |
| Vecinos y Comunidad Local | Entorno del proyecto | Cliente                                 | Bajo                    | Bajo                    | Respeto a horarios permitidos, mitigación de polvo y vallado perimetral durante la obra | Diseño que valore el barrio y canal de comunicación directo para resolver quejas | Externo             | Reticente                            |

## MATRICES DE DESCRIPCIÓN DE INTERESADOS

| Tabla 7 DESCRIPCIÓN MATRIZ DE STAKEHOLDER                                                              |                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b>                                                                                       | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay                                                               |                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Código:</b>                                                                                         | PROY-STO-2026-001                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                                                                | 01/07/2027                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stakeholder:</b>                                                                                    | Mauricio Benítez / Mónica Insfrán                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tipo:</b>                                                                                           | Interno                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
| Objetivo o Resultados                                                                                  | Nivel de Interés                                                                                                                                                              | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                                                                                           |                                                                                                                                         | Estrategias                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                     | De impacto positivo                                                                                                                         | De impacto negativo                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Maximizar la rentabilidad del capital invertido, con cumplimiento estricto del presupuesto y del plazo | Alto                                                                                                                                                                          | Alto                | Agilidad en la toma de decisiones: liberación rápida de fondos, aprobaciones oportunas de planos y resolución expedita de órdenes de cambio | Indecisión o cambios tardíos en el alcance: modificar el mix de tamaños de boxes con la obra avanzada, generando sobrecostos y retrasos | Gobernanza y canales de reporte: reuniones ejecutivas quincenales con dashboard de KPIs, curva S, riesgos activos y reserva de contingencia                                     |
| Entrega de un complejo funcional, seguro y de alta calidad constructiva                                | Alto                                                                                                                                                                          | Alto                | Gestión de relaciones de alto nivel: negociaciones con bancos, inversionistas o autoridades municipales para destrabar permisos complejos   | Burocracia interna o retraso en pagos: demoras en la aprobación de estados de pago mensuales, asfixiando el flujo de caja de la obra    | Congelamiento del alcance: fecha límite estricta en la fase de diseño técnico para definir el layout final de los módulos                                                       |
| Iniciar la fase comercial sin retrasos frente a imprevistos                                            | Alto                                                                                                                                                                          | Alto                | Flexibilidad comercial y financiera: inyección oportuna de capital de trabajo o activación de fondos de contingencia                        | Presión desmedida por plazos comerciales: sacrificar tiempos técnicos de curado, pruebas de estanqueidad o sistemas contra incendios    | Proceso de aprobación de órdenes de cambio ágil (tres alternativas técnicas evaluadas en costo y cronograma) y alineación operativa temprana en las mesas técnicas del proyecto |
| <b>Conclusiones:</b>                                                                                   | Principal interesado y patrocinante del proyecto; su disponibilidad de capital y agilidad decisoria son condición indispensable para sostener el cronograma y el presupuesto. |                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |

| <b>Proyecto:</b>                                             | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay                                        |                     |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>                                               | PROY-STO-2026-001                                                                                                                                      |                     |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                   |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                      | 01/07/2027                                                                                                                                             |                     |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                   |
| <b>Stakeholder:</b>                                          | Banco / Entidades Financieras                                                                                                                          |                     |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                   |
| <b>Tipo:</b>                                                 | Externo                                                                                                                                                |                     |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                   |
| Objetivo o Resultados                                        | Nivel de Interés                                                                                                                                       | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                         |                                                                    | Estrategias                                                                                                       |
|                                                              |                                                                                                                                                        |                     | De impacto positivo                                                       | De impacto negativo                                                |                                                                                                                   |
| Asegurar el retorno del capital prestado más los intereses   | Alto                                                                                                                                                   | Alto                | Financiamiento estable: inyección de capital a tasas competitivas         | Restricciones de flujo: congelamiento de fondos por incumplimiento | Monitoreo y transparencia: estados financieros auditados y reportes de avance a tiempo                            |
| Mitigar el riesgo de impago y cumplir garantías del contrato | Alto                                                                                                                                                   | Alto                | Respaldo institucional: mejora la credibilidad del proyecto ante terceros | Costos financieros altos: incremento de tasas o penalizaciones     | Garantías sólidas (activos de respaldo en regla) y comunicación proactiva ante cualquier desvío del flujo de caja |
| <b>Conclusiones:</b>                                         | Financiador externo del proyecto; su continuidad depende de la disciplina en la rendición de cuentas y del cumplimiento del cronograma de desembolsos. |                     |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                   |

| <b>Proyecto:</b>                                                                        | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay                  |                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>                                                                          | PROY-STO-2026-001                                                                                                                |                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                                                 | 01/07/2027                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| <b>Stakeholder:</b>                                                                     | Arquitecto                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| <b>Tipo:</b>                                                                            | Interno                                                                                                                          |                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |
| Objetivo o Resultados                                                                   | Nivel de Interés                                                                                                                 | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                                                                                 |                                                                                                                                | Estrategias                                                                                                                           |
|                                                                                         |                                                                                                                                  |                     | De impacto positivo                                                                                                               | De impacto negativo                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| Entregar el diseño arquitectónico completo, cumpliendo los plazos de la etapa de diseño | Alto                                                                                                                             | Alto                | Propone soluciones espaciales eficientes, entrega documentación técnica clara y detalla acabados correctamente, evitando retrasos | Retrasos en entregas, diseño inviable constructivamente o resistencia a modificarlo por sugerencias técnicas o presupuestarias | Integración desde el día uno con la coordinación técnica; calendario estricto de entregas parciales; canales de comunicación abiertos |
| <b>Conclusiones:</b>                                                                    | Responsable del producto base sobre el cual se coordinan las demás ingenierías; su cumplimiento condiciona el inicio de la obra. |                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                       |

| <b>Proyecto:</b>                                                                                           | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay                      |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>                                                                                             | PROY-STO-2026-001                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                                                                    | 01/07/2027                                                                                                                           |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| <b>Stakeholder:</b>                                                                                        | Ingeniero Civil                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| <b>Tipo:</b>                                                                                               | Interno                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| Objetivo o Resultados                                                                                      | Nivel de Interés                                                                                                                     | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                                                                                          |                                                                                                                  | Estrategias                                                                                                                              |
|                                                                                                            |                                                                                                                                      |                     | De impacto positivo                                                                                                                        | De impacto negativo                                                                                              |                                                                                                                                          |
| Garantizar la compatibilización de todas las ingenierías, la constructibilidad y el cumplimiento de plazos | Alto                                                                                                                                 | Alto                | Detección de interferencias antes de la obra, optimiza costos estructurales, mantiene al equipo alineado y acelera el flujo de información | Falta de liderazgo, mala comunicación entre especialistas u omisión de errores que salen a la luz recién en obra | Autoridad para liderar las reuniones técnicas; herramientas BIM para detección de interferencias; KPIs de reducción de órdenes de cambio |
| <b>Conclusiones:</b>                                                                                       | Coordinador técnico del proyecto ejecutivo; su liderazgo evita interferencias costosas entre especialidades durante la construcción. |                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |

| <b>Proyecto:</b>                                                               | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay                                 |                     |                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>                                                                 | PROY-STO-2026-001                                                                                                                               |                     |                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                                        | 01/07/2027                                                                                                                                      |                     |                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Stakeholder:</b>                                                            | Empresa Constructora                                                                                                                            |                     |                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipo:</b>                                                                   | Interno                                                                                                                                         |                     |                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| Objetivo o Resultados                                                          | Nivel de Interés                                                                                                                                | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                               |                                                                                                                  | Estrategias                                                                                                                                                                           |
|                                                                                |                                                                                                                                                 |                     | De impacto positivo                                                             | De impacto negativo                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
| Ejecutar la obra optimizando márgenes de ganancia dentro del plazo contractual | Alto                                                                                                                                            | Alto                | Alta productividad, cero accidentes laborales y correcta ejecución de las obras | Huelgas, accidentes de trabajo por falta de EPI, fallos de nivelación o sobrecostos de materiales y mano de obra | Control estricto de plazos y costos de obra; control de normativas de seguridad y salud ocupacional; capacitación específica en precisión de terminaciones (planicidad, estanqueidad) |
| <b>Conclusiones:</b>                                                           | Ejecutor principal de la obra civil; su desempeño determina directamente el cumplimiento del Componente N.º 3, el de mayor peso presupuestario. |                     |                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |

| <b>Proyecto:</b>                                          | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay                         |                     |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>                                            | PROY-STO-2026-001                                                                                                                       |                     |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                       |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                   | 01/07/2027                                                                                                                              |                     |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                       |
| <b>Stakeholder:</b>                                       | Fiscal de Obras                                                                                                                         |                     |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                       |
| <b>Tipo:</b>                                              | Interno                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                       |
| Objetivo o Resultados                                     | Nivel de Interés                                                                                                                        | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                                                              |                                                                                                         | Estrategias                                                                                           |
|                                                           |                                                                                                                                         |                     | De impacto positivo                                                                                            | De impacto negativo                                                                                     |                                                                                                       |
| Certificar el cumplimiento técnico y agilizar desembolsos | Alto                                                                                                                                    | Alto                | Aprobación ágil de fases clave (cimentaciones, estructuras, seguridad), agilizando los desembolsos financieros | Paralización de la obra por incumplimientos normativos o de seguridad, retrasando la apertura comercial | Mantener satisfecho / gestionar de cerca: involucrarlo desde la revisión final del proyecto ejecutivo |
| Detectar vicios y optimizar procesos constructivos        | Alto                                                                                                                                    | Alto                | Detección temprana de vicios antes de que afecten la ruta crítica                                              | Rechazo de certificaciones de avance, bloqueando el flujo de caja de la constructora                    | Comunicación transparente y proactiva: comités técnicos semanales                                     |
| Optimizar el uso de recursos sin rigidez excesiva         | Alto                                                                                                                                    | Alto                | Sugerencia de mejoras técnicas que reducen costos o tiempos manteniendo la calidad                             | Rigidez burocrática en observaciones menores que detienen el montaje de componentes prefabricados       | Canal de discrepancias formal y auditorías de seguridad conjuntas semanales                           |
| <b>Conclusiones:</b>                                      | Contralor técnico independiente de la obra; su rigor certifica que los desembolsos a la constructora respondan a un avance físico real. |                     |                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                       |



| <b>Proyecto:</b>                                                                  | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay                                                |                     |                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>                                                                    | PROY-STO-2026-001                                                                                                                                              |                     |                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                  |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                                           | 01/07/2027                                                                                                                                                     |                     |                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                  |
| <b>Stakeholder:</b>                                                               | Auditor Externo                                                                                                                                                |                     |                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                  |
| <b>Tipo:</b>                                                                      | Externo                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                  |
| Objetivo o Resultados                                                             | Nivel de Interés                                                                                                                                               | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                                                 |                                                                                                       | Estrategias                                                                                                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                |                     | De impacto positivo                                                                               | De impacto negativo                                                                                   |                                                                                                                  |
| Verificar el uso correcto de los fondos del proyecto                              | Alto                                                                                                                                                           | Bajo                | Acceso irrestricto, oportuno y transparente a contratos, presupuestos, facturas y estados de pago | Documentación incompleta o entregada fuera de plazo, que impide reconstruir la trazabilidad del gasto | Sistema de control interno digitalizado que reduzca el riesgo de errores manuales en facturación y compras       |
| Comprobar la trazabilidad del flujo de caja respaldada en certificaciones de obra | Alto                                                                                                                                                           | Bajo                | Cada desembolso justificado por el avance físico verificado de la obra                            | Desviaciones presupuestarias o de cronograma no reportadas ni identificadas a tiempo                  | Planes de acción correctiva formalizados ante cualquier desviación detectada                                     |
| Verificar el cumplimiento de las normativas fiscales y contables locales          | Alto                                                                                                                                                           | Bajo                | Registro riguroso de activos, pasivos e inventarios de materiales de alto valor en obra           | Hallazgos u observaciones de auditoría sin cerrar al momento del cierre fiscal                        | Disponibilidad periódica de la gerencia y del equipo administrativo para conciliaciones y colaboración proactiva |
| <b>Conclusiones:</b>                                                              | Su influencia directa sobre las decisiones del proyecto es baja, pero su informe final condiciona la validación del cierre financiero ante los inversionistas. |                     |                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                                  |

| <b>Proyecto:</b>                                                              | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay                     |                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>                                                                | PROY-STO-2026-001                                                                                                                   |                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                            |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                                       | 01/07/2027                                                                                                                          |                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                            |
| <b>Stakeholder:</b>                                                           | Equipo de Operaciones                                                                                                               |                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                            |
| <b>Tipo:</b>                                                                  | Interno                                                                                                                             |                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                            |
| Objetivo o Resultados                                                         | Nivel de Interés                                                                                                                    | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                                         |                                                                                     | Estrategias                                                                                |
|                                                                               |                                                                                                                                     |                     | De impacto positivo                                                                       | De impacto negativo                                                                 |                                                                                            |
| Recibir un diseño modular que optimice el espacio alquilable y la circulación | Bajo                                                                                                                                | Alto                | Sistemas de control de acceso automatizado y CCTV integrados desde el diseño              | Materiales de baja durabilidad que incrementan el mantenimiento futuro del complejo | Participación en las mesas técnicas donde se definan los sistemas de acceso y seguridad    |
| Contar con una infraestructura de bajo mantenimiento y operación fluida       | Bajo                                                                                                                                | Alto                | Zona de carga y descarga techada y oficina administrativa climatizada, listas para operar | Ausencia de manual de operaciones o de capacitación previa a la entrega             | Entrega con manual de operaciones de sistemas y garantías extendidas en portones y techado |
| <b>Conclusiones:</b>                                                          | Aunque no participa activamente durante la construcción, condiciona con sus requisitos el diseño técnico que la obra debe entregar. |                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                            |

| <b>Proyecto:</b>                                       | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay  |                     |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>                                         | PROY-STO-2026-001                                                                                                |                     |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                     |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                | 01/07/2027                                                                                                       |                     |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                     |
| <b>Stakeholder:</b>                                    | Autoridades Municipales y Reguladores                                                                            |                     |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                     |
| <b>Tipo:</b>                                           | Externo                                                                                                          |                     |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                     |
| Objetivo o Resultados                                  | Nivel de Interés                                                                                                 | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                                             |                                                                                          | Estrategias                                                                                         |
|                                                        |                                                                                                                  |                     | De impacto positivo                                                                           | De impacto negativo                                                                      |                                                                                                     |
| Verificar el cumplimiento del plan regulador municipal | Alto                                                                                                             | Alto                | Cumplimiento estricto de retiros obligatorios y coeficientes de edificabilidad                | Incumplimientos normativos que deriven en observaciones o paralización de la obra        | Presentación completa y oportuna de la documentación exigida por la Municipalidad de Luque          |
| Autorizar la habilitación comercial del complejo       | Alto                                                                                                             | Alto                | Aprobación ágil del proyecto contra incendios (PCI) y del Estudio de Impacto Ambiental y Vial | Incidentes en la vía pública o daños a infraestructura municipal durante la construcción | Transparencia y agilidad en la presentación de planos "conforme a obra" ante cualquier modificación |
| <b>Conclusiones:</b>                                   | Su aprobación es condición legal indispensable para el inicio de obra y para la apertura comercial del complejo. |                     |                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                     |

| <b>Proyecto:</b>                                             | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay            |                     |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>                                               | PROY-STO-2026-001                                                                                                          |                     |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                            |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                      | 01/07/2027                                                                                                                 |                     |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                            |
| <b>Stakeholder:</b>                                          | Clientes Finales                                                                                                           |                     |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                            |
| <b>Tipo:</b>                                                 | Externo                                                                                                                    |                     |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                            |
| Objetivo o Resultados                                        | Nivel de Interés                                                                                                           | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                                                                    |                                                                                | Estrategias                                                                |
|                                                              |                                                                                                                            |                     | De impacto positivo                                                                                                  | De impacto negativo                                                            |                                                                            |
| Contar con unidades seguras, estancas y de acceso controlado | Alto                                                                                                                       | Medio               | Unidades 100% libres de filtraciones, humedad, polvo y plagas, con control de acceso individual (PIN, app o tarjeta) | Fallas de seguridad o de estanqueidad que reduzcan la confianza en el servicio | Mantenimiento preventivo periódico y monitoreo del sistema de seguridad    |
| Acceder al servicio de manera ágil, flexible y digital       | Alto                                                                                                                       | Medio               | Contratación 100% digital, pasillos amplios y carretillas de uso libre                                               | Horarios de acceso restringidos que limiten el uso del servicio                | Ampliación gradual de los horarios de acceso hacia una disponibilidad 24/7 |
| <b>Conclusiones:</b>                                         | Su nivel de satisfacción determina directamente la velocidad de ocupación comercial proyectada en la Matriz de Resultados. |                     |                                                                                                                      |                                                                                |                                                                            |

| <b>Proyecto:</b>                                                   | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay                     |                     |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b>                                                     | PROY-STO-2026-001                                                                                                                   |                     |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |
| <b>Fecha de Inicio:</b>                                            | 01/07/2027                                                                                                                          |                     |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |
| <b>Stakeholder:</b>                                                | Vecinos y Comunidad Local                                                                                                           |                     |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |
| <b>Tipo:</b>                                                       | Externo                                                                                                                             |                     |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |
| Objetivo o Resultados                                              | Nivel de Interés                                                                                                                    | Nivel de Influencia | Acciones Posibles                                                                                   |                                                                             | Estrategias                                                                                     |
|                                                                    |                                                                                                                                     |                     | De impacto positivo                                                                                 | De impacto negativo                                                         |                                                                                                 |
| Minimizar las molestias generadas durante la etapa de construcción | Bajo                                                                                                                                | Bajo                | Respeto a los horarios permitidos y vallado perimetral que aisle la obra de las propiedades vecinas | Obstrucción de accesos vecinales por camiones de obra y generación de polvo | Mitigación de polvo y lavado de llantas de camiones al salir de la obra                         |
| No percibir afectación una vez el complejo esté operativo          | Bajo                                                                                                                                | Bajo                | Diseño arquitectónico que valore el barrio y funcionamiento silencioso del proyecto                 | Ruido o tránsito excesivo de clientes durante el funcionamiento comercial   | Canal de comunicación directo con la dirección de obra y, luego, con la gerencia de operaciones |
| <b>Conclusiones:</b>                                               | Su posición reticente inicial puede revertirse mediante comunicación proactiva, dado su bajo poder de influencia sobre el proyecto. |                     |                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                 |

## **GESTIÓN DE COMUNICACIONES**

Un proyecto con inversionistas, profesionales de diseño, una constructora, una fiscalización independiente y autoridades municipales no puede depender de que la información llegue por casualidad a quien la necesita. El Acta de Constitución ya previó esto: designó al Coordinador de Proyecto como el punto por el que pasará toda la información relevante durante la ejecución, con la responsabilidad de decidir a quién corresponde cada mensaje y con qué urgencia.

A partir de ese rol se organizan tres canales. Cada quince días, el Coordinador de Proyecto elevará al Comité de Dirección un reporte de avance tipo semáforo: verde si el componente en curso está en fecha, amarillo si hay una alerta a monitorear, y rojo si ya existe un retraso confirmado. Una vez al mes se suma una reunión de revisión, presencial o virtual, donde se aprueban las certificaciones de obra del período y se liberan los fondos del siguiente. Y si se materializa un riesgo crítico (una clausura municipal temporal, una huelga de proveedores, una tormenta que dañe la estructura en construcción), existe un tercer canal de emergencia: el Comité deberá reunirse en sesión extraordinaria dentro de las 24 horas posteriores al hecho. Larson y Gray (2020) señalan que esta combinación de reportes escritos periódicos y reuniones presenciales resulta más efectiva, en proyectos con múltiples contratistas, que apoyarse en un único canal de comunicación.

El ritmo cambia según qué se esté negociando o construyendo en cada momento. Mientras dure la búsqueda del terreno, el Coordinador de Proyecto y el asesor inmobiliario se reportarán semanalmente, con un último contacto puntual al cerrar la compra. Escriturado el inmueble, el foco pasa al Arquitecto y al Ingeniero Civil: sus entregables de diseño necesitarán validación

continúa antes de avanzar a la siguiente fase. El Administrador de gestiones, en cambio, informará por su cuenta cada quince días sobre el estado de los trámites en la Municipalidad de Luque, con reportes más frecuentes si alguna observación municipal queda pendiente de respuesta.

La obra civil concentra el mayor presupuesto y la ruta crítica del proyecto, así que también concentra la mayor exigencia de comunicación. La constructora y la fiscalización se reunirán cada semana con el Coordinador de Proyecto en comités técnicos, para revisar el avance físico antes de autorizar cada certificado de pago. Cualquier vicio o incumplimiento se reportará de inmediato por el canal de emergencia, sin esperar al reporte quincenal siguiente. Durante toda la ejecución, el Coordinador de Proyecto y el Especialista Fiduciario mantendrán al Comité de Dirección informado por los mismos canales quincenal y mensual. Recién hacia el cierre se abre un canal más: uno directo entre la Auditoría Externa y la gerencia administrativa, para entregar la documentación de soporte que su informe final necesite.

Fuera de la cadena de contratistas, otros interesados requerirán una comunicación distinta, menos frecuente pero igualmente planificada. Al futuro equipo de operaciones se lo convocará puntualmente, en las mesas técnicas donde se definan los sistemas de acceso y seguridad, para que el diseño entregado responda a sus necesidades operativas. A los vecinos del entorno se les habilitará un canal directo con la dirección de obra, pensado para resolver reclamos por ruido o por el tránsito de camiones antes de que escalen a una queja formal ante la Municipalidad.

La Matriz de Comunicaciones que sigue organiza estas interacciones por interesado, propósito, contenido y frecuencia.



### MATRIZ DE COMUNICACIONES<sup>3</sup>

**Tabla 8 MATRIZ DE COMUNICACIONES**

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proyecto:</b> | Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras “Self Storage” en la ciudad de Luque, Paraguay |
| <b>ID:</b>       | PROY-STO-2026-001                                                                                               |

| Elemento de la EDT                                         | Objetivo                                                                    |                                                                                         | Usuario                                      |                                                           | Responsabilidad                              |                         | Tiempo        |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                            | ¿Qué comunicamos?                                                           | ¿Por qué?                                                                               | Destinatario                                 | Método de Comunicación                                    | Preparación                                  | Envío                   | Fecha inicial | Frecuencia                                                      |
| 1.1 Terreno adquirido                                      | Avance de la tasación y estado de la negociación del terreno                | Confirmar que la compra se concrete dentro del plazo y del presupuesto del Componente 1 | Coordinador de Proyecto                      | Reporte escrito + contacto puntual al cierre de la compra | Asesor inmobiliario                          | Coordinador de Proyecto | 08/07/2027    | Semanal, hasta la firma del contrato                            |
| 2.1 Depósito diseñado                                      | Estado de avance del proyecto arquitectónico y de los diseños estructurales | Validar cada entregable antes de que condicione el inicio de la obra                    | Coordinador de Proyecto                      | Reunión de validación técnica                             | Arquitecto / Ingeniero Civil                 | Coordinador de Proyecto | 08/09/2027    | Continua, según hitos de entrega                                |
| 2.2 Licencias comerciales y permisos municipales obtenidos | Estado de los trámites ante la Municipalidad de Luque                       | Anticipar demoras que retrasen la aprobación de planos y el inicio de obra              | Coordinador de Proyecto                      | Informe escrito                                           | Administrador de gestiones                   | Coordinador de Proyecto | 11/10/2027    | Quincenal, más frecuente si hay observación municipal pendiente |
| 3.1 Galpón construido y equipado                           | Avance físico de la obra civil y del equipamiento del tinglado              | Autorizar cada certificado de pago solo contra avance verificado                        | Coordinador de Proyecto, Comité de Dirección | Comité técnico semanal + reporte quincenal tipo semáforo  | Empresa constructora / Fiscalización de obra | Coordinador de Proyecto | 28/10/2027    | Semanal (comité técnico) y quincenal (reporte al Comité)        |

<sup>3</sup> Matriz elaborada con base en principios de gestión de proyectos. Fuente: elaboración propia.

| Elemento de la EDT                    | Objetivo                                                                     |                                                                                 | Usuario                 |                                                               | Responsabilidad                                   |                         | Tiempo        |                                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|                                       | ¿Qué comunicamos?                                                            | ¿Por qué?                                                                       | Destinatario            | Método de Comunicación                                        | Preparación                                       | Envío                   | Fecha inicial | Frecuencia                                          |
| 4.1 Equipo de proyecto contratado     | Control financiero, cumplimiento de hitos y estado general del proyecto      | Mantener informado al Comité de Dirección para la liberación oportuna de fondos | Comité de Dirección     | Reporte quincenal tipo semáforo + reunión mensual de revisión | Coordinador de Proyecto / Especialista Fiduciario | Coordinador de Proyecto | 01/07/2027    | Quincenal y mensual                                 |
| 4.2 Contratación de Auditoría Externa | Documentación de soporte y conciliaciones para el informe final de auditoría | Verificar el uso correcto de los fondos antes del cierre del proyecto           | Gerencia administrativa | Solicitud formal de documentación + informe final             | Auditoría Externa                                 | Gerencia administrativa | 11/04/2028    | Puntual, durante la etapa de ejecución del contrato |

## CONCLUSIÓN

El complejo de depósitos y bauleras proyectado para la ciudad de Luque surge de una necesidad concreta del mercado y se ordena bajo una lógica de planificación que respalda cada decisión, desde la adquisición del terreno hasta la puesta a disposición de las unidades para su alquiler.

La propuesta se organizó en cuatro componentes encadenados. El primero resuelve la adquisición del inmueble de 368 m<sup>2</sup>, condición sin la cual ninguna etapa siguiente puede iniciarse. El segundo reúne el diseño arquitectónico y estructural junto con los trámites de habilitación ante la Municipalidad de Luque. El tercero concentra el mayor esfuerzo del proyecto, la construcción del tinglado de 308 m<sup>2</sup> y su equipamiento, acompañada de una fiscalización independiente. El cuarto atraviesa todo el recorrido mediante la coordinación general, el control financiero y una revisión final que comprueba el uso adecuado de los fondos. Cada uno deja un resultado tangible y verificable (un terreno escriturado, un diseño aprobado, las licencias en regla, el galpón terminado), de modo que el avance no queda sujeto a la interpretación de quien lo ejecuta.

La inversión de Gs. 900.900.000 se distribuye según el peso real de cada etapa y no bajo un reparto uniforme: la obra civil absorbe cerca de dos tercios del total (583.000.000), seguida por la coordinación y el control del proyecto (132.900.000), la adquisición del terreno (120.000.000) y el diseño y las licencias (65.000.000). El calendario, que se extiende entre julio de 2027 y mayo de 2028, responde a esa misma lógica de dependencias antes que a una simple sumatoria de plazos: la adquisición del inmueble y la construcción no admiten demora,

mientras que el diseño y la tramitación de permisos disponen de cierto margen para reacomodarse sin detener al conjunto.

El análisis identificó siete riesgos con capacidad de alterar los plazos o incrementar los costos, la mayoría ligados a la contratación tardía de profesionales y contratistas clave, junto con las lluvias intensas que la ciudad de Luque registra entre octubre y abril y la posible variación en el precio de materiales como el acero y el cemento. La respuesta se definió caso por caso: contratación asegurada en fecha donde el problema es de agenda, transferencia del riesgo climático a la constructora mediante plazos firmes y penalidades, y un límite contractual al sobre costo de materiales.

La conducción del proyecto quedó definida en niveles claros, con el grupo de inversores concentrando la autoridad sobre alcance, costo y plazo, el Coordinador del Proyecto como único canal de coordinación y de información, y los equipos de ingeniería y comercial trabajando más próximos a la ejecución. Ese seguimiento se apoyará, una vez iniciada la obra, en los indicadores de valor ganado del PMBOK (costo planificado, costo real y valor ganado), comparados en cada informe quincenal contra la línea base aquí establecida, para advertir con datos concretos si el proyecto avanza conforme a lo previsto.

Los ocho contratos previstos, desde la asesoría inmobiliaria hasta la revisión final de las cuentas, se adjudicaron bajo la modalidad más afín a su naturaleza: consultoría profesional donde prevalece el criterio técnico, y contratación de obra donde resultan determinantes el plazo y la calidad de ejecución.

Este emprendimiento demuestra que planificar con método no es un recurso reservado a las grandes obras: un proyecto de escala mediana como este se beneficia igual de un trabajo bien desagregado, un cronograma con dependencias explícitas y una mirada anticipada sobre lo que puede fallar. Dado que en Paraguay este tipo de servicio dispone todavía de pocos antecedentes formalizados, la manera en que aquí se estructuró la operación, sustentada en cifras y plazos reales antes que, en estimaciones generales, puede constituir una referencia para quienes evalúen desarrollar un complejo similar en otra ciudad del país.

## LISTA DE ABREVIATURAS

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANDE</b>    | Administración Nacional de Electricidad                                                   |
| <b>BIM</b>     | Building Information Modeling (Modelado de Información para la Construcción)              |
| <b>CCTV</b>    | Circuito Cerrado de Televisión                                                            |
| <b>DINAC</b>   | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil                                                   |
| <b>DMH</b>     | Dirección de Meteorología e Hidrología                                                    |
| <b>EDT</b>     | Estructura Desglosada del Trabajo                                                         |
| <b>EPI</b>     | Equipo de Protección Individual                                                           |
| <b>Gs. / ₵</b> | Guaraníes (moneda nacional del Paraguay)                                                  |
| <b>KPI</b>     | Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño)                                  |
| <b>PCI</b>     | Prevención y Combate Contra Incendios                                                     |
| <b>PMBOK</b>   | Project Management Body of Knowledge (Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos) |
| <b>QR</b>      | Código de Respuesta Rápida (Quick Response)                                               |
| <b>SMART</b>   | Específico, Medible, Alcanzable, Realista y con Tiempo definido                           |
| <b>USD</b>     | Dólar de los Estados Unidos                                                               |

## GLOSARIO

**Acta de Constitución del Proyecto.** Documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto y fija de manera preliminar su alcance, su plazo, su presupuesto y su estructura de conducción, sirviendo como referencia para las decisiones que se toman durante la ejecución.

**Anticipo.** Pago inicial entregado a un contratista antes del comienzo de los trabajos, destinado a cubrir los primeros gastos de materiales y movilización, que luego se descuenta de las certificaciones sucesivas.

**Auditoría externa.** Revisión independiente que verifica, hacia el cierre del proyecto, que los fondos se hayan utilizado conforme a lo previsto y que cada desembolso responda al avance real de la obra.

**Baulera.** Unidad individual de almacenamiento, de superficie reducida, que se alquila para guardar bienes personales o comerciales dentro del complejo.

**Certificado de avance de obra.** Documento que constata el trabajo efectivamente ejecutado en un período y habilita el pago correspondiente al contratista, previa validación de la fiscalización.

**Comparación de precios.** Modalidad de contratación en la que se solicitan cotizaciones a varios proveedores y se adjudica a la oferta más conveniente en precio y condiciones. En el proyecto se aplica a la asesoría inmobiliaria y a la obra civil.

**Contratación directa.** Modalidad en la que se contrata a un proveedor determinado sin un proceso comparativo, empleada en el proyecto para el servicio continuo de gestión de trámites municipales.

**Curva S.** Representación gráfica del costo acumulado del proyecto en función del tiempo, cuyo trazado adopta la forma de una S por el ritmo lento de los desembolsos al inicio y al cierre y su aceleración en el tramo central de mayor actividad.

**Especialista Fiduciario.** Profesional responsable del control financiero del proyecto, encargado de vigilar que los fondos se ejecuten según el presupuesto y de respaldar la rendición de cuentas ante los inversionistas.

**Estanqueidad.** Condición de una construcción que impide el ingreso de agua, humedad o polvo, requisito esencial en las unidades de almacenamiento para resguardar los bienes depositados.

**Estructura Desglosada del Trabajo.** Descomposición jerárquica del proyecto en componentes, productos y paquetes de trabajo, que organiza y delimita la totalidad del alcance sin descender al detalle de las actividades.

**Fiscalización de obra.** Servicio independiente que supervisa la ejecución de la construcción, verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los plazos, y valida los avances antes de autorizar cada pago.

**Hito.** Punto de referencia dentro del cronograma que marca la conclusión de una etapa relevante o un evento de control, sin consumir tiempo ni recursos por sí mismo.

**Línea de base.** Estado o valor de referencia registrado antes del inicio de la ejecución, contra el cual se mide el avance real y se detectan las desviaciones de plazo, costo o alcance.

**Paquete de trabajo.** Nivel más bajo de la estructura de desglose, correspondiente a un entregable concreto cuyo tiempo y costo pueden estimarse, controlarse y asignarse a un responsable.

**Retención de garantía (retención caucional).** Porcentaje del pago que se retiene a un contratista como resguardo del cumplimiento y de la calidad de la obra, y que se libera recién con la recepción definitiva.

**Ruta crítica.** Secuencia de tareas encadenadas cuya demora se traslada de forma directa a la fecha de finalización del proyecto, por carecer de holgura entre sí.



**Self storage (auto-almacenamiento).** Modalidad de servicio que ofrece en alquiler unidades individuales de depósito de distintos tamaños, con acceso controlado, para uso residencial o comercial.

**Terna competitiva.** Modalidad de contratación en la que se invita al menos a tres oferentes a presentar propuestas y se selecciona la más conveniente. En el proyecto se aplica a los servicios de consultoría profesional.

**Tinglado.** Estructura techada de amplia superficie, por lo general de perfiles metálicos, que constituye la nave principal donde se disponen las unidades de almacenamiento.

**Zonificación.** Clasificación del uso del suelo definida por la normativa municipal, que determina si un terreno resulta apto para el destino comercial previsto por el proyecto.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Congreso de la Nación Paraguaya. (2010). *Ley N° 3.966, Orgánica Municipal*. Asunción, Paraguay: Gaceta Oficial de la República del Paraguay. Obtenido de <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/2016/ley-n-3966-organica-municipal>
- Congreso de la Nación Paraguaya. (2013). *Ley N° 4.678/2013, Que reglamenta la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios en los contratos de obras públicas*. Asunción, Paraguay: Gaceta Oficial de la República del Paraguay. Obtenido de <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/1230/ley-n-4678-reglamenta-la-aplicacion-de-las-formulas-de-reajuste-de-precios-en-los-contratos-de-obras-publicas>
- Congreso de la Nación Paraguaya. (2022). *Ley N° 7.021, de Suministro y Contrataciones Públicas*. Asunción, Paraguay: Gaceta Oficial de la República del Paraguay. Obtenido de <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/11220/ley-n-7021-de-suministro-y-contrataciones-publicas>
- Diario HOY. (22 de octubre de 2019). Espacio Plus: el primer servicio de “Self Storage” en Paraguay. *Diario HOY*. Obtenido de <https://www.hoy.com.py/empresariales/espacio-plus-el-primer-servicio-de-self-storage-en-paraguay>
- Dirección de Meteorología e Hidrología. (s.f.). *Anuario climatológico*. Obtenido de Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC): <https://www.meteorologia.gov.py/publicaciones/>
- Echavarria, D., Grund, K., & Lee, E. (2024). Modeling supply and demand in the self-storage market using Data Envelopment Analysis (DEA). *Management Review: An International Journal*, 19(2), 78-114. Obtenido de <https://doi.org/10.55819/mrij.2024.19.2.78>
- Extra Metros. (s.f.). *Alquiler de depósitos self storage en Luque*. Obtenido de Extra Metros: <https://www.extrametros.com.py/>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston, MA: Pitman.
- Gido, J., Clements, J., & Baker, R. (2018). *Successful project management* (7.<sup>a</sup> ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

- Guarde Aquí. (s.f.). *Alquiler de depósitos y bauleras en Asunción*. Obtenido de Guarde Aquí: <https://guardeaqui.com.py/>
- Instituto Nacional de Estadística. (2024). *Estimaciones y proyecciones de la población en Paraguay 1950-2050*. Asunción, Paraguay: INE.
- Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12.<sup>a</sup> ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Larson, E. W., & Gray, C. F. (2020). *Project management: The managerial process* (8.<sup>a</sup> ed.). Nueva York, NY: McGraw-Hill Education.
- Más Espacio Paraguay. (s.f.). *Quiénes somos*. Obtenido de Más Espacio Paraguay: <https://masespacio.com.py/quienes-somos/>
- Ortegón, E., Pacheco, J. F., & Prieto, A. (2005). *Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas*. Santiago de Chile: CEPAL-ILPES.
- Pellicer, E., Yepes, V., Teixeira, J. C., Moura, H. P., & Catalá, J. (2014). *Construction management*. Chichester, Reino Unido: Wiley-Blackwell.
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide)* (7.<sup>a</sup> ed.). Newtown Square, PA: Project Management Institute.
- Savelsbergh, M., & Van Woensel, T. (2016). City logistics: Challenges and opportunities. *Transportation Science*, 50(2), 579-590.


## ANEXO I - MATRIZ DE GESTIÓN DE TIEMPO


| CODIGO EDT      | ESTRUCTURA DEL TRABAJO                                                                 | DURACIÓN       | PROCESADORAS            | COMIENZO            | FIN                 | COSTO                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>A1</b>       | <b>Componente N° 1. Inmueble</b>                                                       | <b>65 días</b> |                         | <b>jue 8/7/27</b>   | <b>mié 6/10/27</b>  | <b>120.000.000 G</b> |
| <b>A1.1</b>     | <b>Producto 1. Terreno Adquirido</b>                                                   | <b>65 días</b> |                         | <b>jue 8/7/27</b>   | <b>mié 6/10/27</b>  | <b>120.000.000 G</b> |
| A1.1.1          | Adquisición del terreno                                                                | 65 días        |                         | jue 8/7/27          | mié 6/10/27         | 120.000.000 G        |
| <b>A1.1.1.1</b> | <b>Etapas de contratación</b>                                                          | <b>7 días</b>  |                         | <b>jue 8/7/27</b>   | <b>vie 16/7/27</b>  | <b>0 G</b>           |
| A1.1.1.1.1      | Busqueda de ofertas de terrenos en la zona                                             | 7 días         | 56                      | jue 8/7/27          | vie 16/7/27         | 0 G                  |
| <b>A1.1.1.2</b> | <b>Etapas de ejecución</b>                                                             | <b>37 días</b> |                         | <b>lun 19/7/27</b>  | <b>mar 7/9/27</b>   | <b>0 G</b>           |
| A1.1.1.2.1      | Tasación y evaluación de opciones más convenientes                                     | 7 días         | 5                       | lun 19/7/27         | mar 27/7/27         | 0 G                  |
| A1.1.1.2.2      | Firma de contrato y transferencia de compra del terreno                                | 30 días        | 7                       | mié 28/7/27         | mar 7/9/27          | 0 G                  |
| A1.1.1.3        | Calendario de pagos                                                                    | 36 días        |                         | mié 18/8/27         | mié 6/10/27         | 120.000.000 G        |
| A1.1.1.3.1      | Pago tasación                                                                          | 1 día          | 7FC+15 días             | mié 18/8/27         | mié 18/8/27         | 500.000 G            |
| A1.1.1.3.2      | Pago terreno y escritura                                                               | 1 día          | 8FC+0,91 mss            | mié 6/10/27         | mié 6/10/27         | 119.500.000 G        |
| <b>A1.2</b>     | <b>Fin Componente 1</b>                                                                | <b>0 días</b>  | <b>11;10</b>            | <b>mié 6/10/27</b>  | <b>mié 6/10/27</b>  | <b>0 G</b>           |
| <b>A2</b>       | <b>Componente N° 2. Diseño, Licencias y permisos</b>                                   | <b>75 días</b> |                         | <b>mié 8/9/27</b>   | <b>mar 21/12/27</b> | <b>65.000.000 G</b>  |
| <b>A2.1</b>     | <b>Producto 2. Depósito diseñado</b>                                                   | <b>42 días</b> |                         | <b>mié 8/9/27</b>   | <b>jue 4/11/27</b>  | <b>30.000.000 G</b>  |
| A2.1.1          | Contratación de Arquitecto para elaboración de proyecto arquitectónico                 | 21 días        | 3                       | jue 7/10/27         | jue 4/11/27         | 19.000.000 G         |
| A2.1.1.1        | Etapas de contratación                                                                 | 2 días         | 8                       | jue 7/10/27         | vie 8/10/27         | 0 G                  |
| A2.1.1.2        | Etapas de ejecución                                                                    | 13 días        | 16                      | lun 11/10/27        | mié 27/10/27        | 0 G                  |
| A2.1.1.3        | Calendario de pago                                                                     | 1 día          |                         | jue 4/11/27         | jue 4/11/27         | 19.000.000 G         |
| A2.1.1.3.1      | Pago Proyecto Arquitectónico                                                           | 1 día          | 17FC+5 días;22FC+5 días | jue 4/11/27         | jue 4/11/27         | 19.000.000 G         |
| A2.1.2          | Contratación de Ingeniero Civil para coordinación del proyecto y diseños estructurales | 21 días        |                         | mié 8/9/27          | mié 6/10/27         | 11.000.000 G         |
| <b>A2.1.2.1</b> | <b>Etapas de contratación</b>                                                          | <b>2 días</b>  | <b>8</b>                | <b>mié 8/9/27</b>   | <b>jue 9/9/27</b>   | <b>0 G</b>           |
| <b>A2.1.2.2</b> | <b>Etapas de ejecución</b>                                                             | <b>13 días</b> | <b>21</b>               | <b>vie 10/9/27</b>  | <b>mar 28/9/27</b>  | <b>0 G</b>           |
| A2.1.2.3        | Calendario de pagos                                                                    | 1 día          |                         | mié 6/10/27         | mié 6/10/27         | 11.000.000 G         |
| A2.1.2.3.1      | Pago Coordinación de proyecto y diseños estructurales                                  | 1 día          | 22FC+5 días             | mié 6/10/27         | mié 6/10/27         | 11.000.000 G         |
| <b>A2.2</b>     | <b>Producto 3. Licencias comerciales y permisos municipales obtenidas</b>              | <b>52 días</b> |                         | <b>lun 11/10/27</b> | <b>mar 21/12/27</b> | <b>35.000.000 G</b>  |

|            |                                                                                                    |            |              |              |              |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| A2.2.1     | Contratación de Administrador encargado de las gestiones                                           | 52 días    |              | lun 11/10/27 | mar 21/12/27 | 35.000.000 G  |
| A2.2.1.1   | Etapas de contratación                                                                             | 2 días     | 8;16         | lun 11/10/27 | mar 12/10/27 | 0 G           |
| A2.2.1.2   | Etapas de ejecución                                                                                | 2 mss      | 27           | mié 13/10/27 | lun 13/12/27 | 0 G           |
| A2.2.1.3   | Calendario de pagos                                                                                | 45 días    |              | mié 20/10/27 | mar 21/12/27 | 35.000.000 G  |
| A2.2.1.3.1 | Pago Administración de Gestiones                                                                   | 1 día      | 27FC+5 días  | mié 20/10/27 | mié 20/10/27 | 10.000.000 G  |
| A2.2.1.3.2 | Pago Administración de Gestiones                                                                   | 1 día      | 28CC+1 ms    | vie 12/11/27 | vie 12/11/27 | 10.000.000 G  |
| A2.2.1.3.3 | Pago Administración de Gestiones                                                                   | 1 día      | 28FC+5 días  | mar 21/12/27 | mar 21/12/27 | 15.000.000 G  |
| A2.3       | Fin Componente 2                                                                                   | 0 días     | 24;30;31;32  | mar 21/12/27 | mar 21/12/27 | 0 G           |
| A3         | Componente N°3. Construcción y supervisión de obra                                                 | 150,4 días |              | jue 28/10/27 | jue 25/5/28  | 583.000.000 G |
| A3.1       | Producto 4. Galpón con depósitos interiores divididos, contruidos y equipados                      | 150,4 días |              | jue 28/10/27 | jue 25/5/28  | 583.000.000 G |
| A3.1.1     | Contratación de empresa constructora. Construcción de un tinglado de 308 m2 y equipamiento interno | 150,4 días |              | jue 28/10/27 | jue 25/5/28  | 570.000.000 G |
| A3.1.1.1   | Etapas de contratación                                                                             | 1 ms       | 17;22        | jue 28/10/27 | vie 26/11/27 | 0 G           |
| A3.1.1.2   | Etapas de ejecución                                                                                | 3 mss      | 37           | lun 29/11/27 | lun 28/2/28  | 0 G           |
| A3.1.1.3   | Calendario de Pago                                                                                 | 123,4 días |              | lun 6/12/27  | jue 25/5/28  | 570.000.000 G |
| A3.1.1.3.1 | Pago de anticipo                                                                                   | 1 día      | 38CC+5 días  | lun 6/12/27  | lun 6/12/27  | 180.500.000 G |
| A3.1.1.3.2 | Pago Certificado 1                                                                                 | 1 día      | 38CC+1,7 mss | mié 19/1/28  | jue 20/1/28  | 180.500.000 G |
| A3.1.1.3.3 | Pago Certificado 2                                                                                 | 1 día      | 41FC+1 ms    | lun 21/2/28  | mar 22/2/28  | 180.500.000 G |
| A3.1.1.3.4 | Pago retención causal y recepción definitiva                                                       | 1 día      | 42FC+3 mss   | mié 24/5/28  | jue 25/5/28  | 28.500.000 G  |
| A3.1.2     | Contratación de Fiscalización de obra                                                              | 128,4 días |              | jue 28/10/27 | mar 25/4/28  | 13.000.000 G  |
| A3.1.2.1   | Etapas de contratación                                                                             | 1 ms       | 37CC         | jue 28/10/27 | vie 26/11/27 | 0 G           |
| A3.1.2.2   | Etapas de ejecución                                                                                | 3 mss      | 45           | lun 29/11/27 | lun 28/2/28  | 0 G           |
| A3.1.2.3   | Calendario de pagos                                                                                | 101,4 días |              | lun 6/12/27  | mar 25/4/28  | 13.000.000 G  |
| A3.1.2.3.1 | Pago de anticipo                                                                                   | 1 día      | 46CC+5 días  | lun 6/12/27  | lun 6/12/27  | 4.000.000 G   |
| A3.1.2.3.2 | Pago Certificado 1                                                                                 | 1 día      | 46CC+1,7 mss | mié 19/1/28  | jue 20/1/28  | 4.000.000 G   |
| A3.1.2.3.3 | Pago Certificado 2                                                                                 | 1 día      | 49FC+1 ms    | lun 21/2/28  | mar 22/2/28  | 4.350.000 G   |
| A3.1.2.3.4 | Pago retención causal y recepción definitiva                                                       | 1 día      | 50FC+2 mss   | lun 24/4/28  | mar 25/4/28  | 650.000 G     |
| A3.2       | Fin Componente 3                                                                                   | 0 días     | 51;38;46     | mar 25/4/28  | mar 25/4/28  | 0 G           |
| A4         | Componente N° 4. Administración del Proyecto                                                       | 228 días   |              | jue 1/7/27   | lun 15/5/28  | 132.900.000 G |
| A4.1       | Equipo de proyecto contratado                                                                      | 225 días   |              | jue 1/7/27   | mié 10/5/28  | 125.000.000 G |
| A4.1.1     | Etapas de contratación                                                                             | 5 días     |              | jue 1/7/27   | mié 7/7/27   | 0 G           |


|               |                                                                                |                   |                    |                    |                    |                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| A4.1.2        | Equipo contratado                                                              | 0 días            | 55                 | mié 7/7/27         | mié 7/7/27         | 0 G                  |
| <b>A4.1.3</b> | <b>E tapa de ejecución</b>                                                     | <b>220 días</b>   |                    | <b>jue 8/7/27</b>  | <b>mié 10/5/28</b> | <b>125.000.000 G</b> |
| A4.1.3.1      | Coordinador de Proyecto                                                        | 10 mss            | 55                 | jue 8/7/27         | mié 10/5/28        | 75.000.000 G         |
| A4.1.3.2      | Especialista Fiduciario                                                        | 10 mss            | 55                 | jue 8/7/27         | mié 10/5/28        | 50.000.000 G         |
| A4.2          | Contratación de Auditoria Externa                                              | 25 días           |                    | mar 11/4/28        | lun 15/5/28        | 7.900.000 G          |
| <b>A4.2.1</b> | <b>E tapa de contratación</b>                                                  | <b>5 días</b>     | <b>56FC+9 mss</b>  | <b>mar 11/4/28</b> | <b>lun 17/4/28</b> | <b>0 G</b>           |
| A4.2.2        | Ejecución de contrato                                                          | 15 días           | 61                 | mar 18/4/28        | lun 8/5/28         | 0 G                  |
| A4.2.3        | Calendario de pagos                                                            | 1 día             |                    | lun 15/5/28        | lun 15/5/28        | 0 G                  |
| A4.2.3.1      | Pago                                                                           | 1 día             | 62FC+4 días        | lun 15/5/28        | lun 15/5/28        | 0 G                  |
| <b>A4.3</b>   | <b>Fin Componente 4</b>                                                        | <b>0 días</b>     | <b>58;59;64</b>    | <b>lun 15/5/28</b> | <b>lun 15/5/28</b> | <b>0 G</b>           |
| <b>A4.4</b>   | <b>Fin de proyecto</b>                                                         | <b>0 días</b>     | <b>12;33;52;65</b> | <b>lun 15/5/28</b> | <b>lun 15/5/28</b> | <b>0 G</b>           |
| <b>A</b>      | <b>Construcción de negocio de alquileres Depósitos y Bauleras Self Storage</b> | <b>235,4 días</b> |                    | <b>jue 1/7/27</b>  | <b>jue 25/5/28</b> | <b>900.900.000 G</b> |

## ANEXO II - DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO

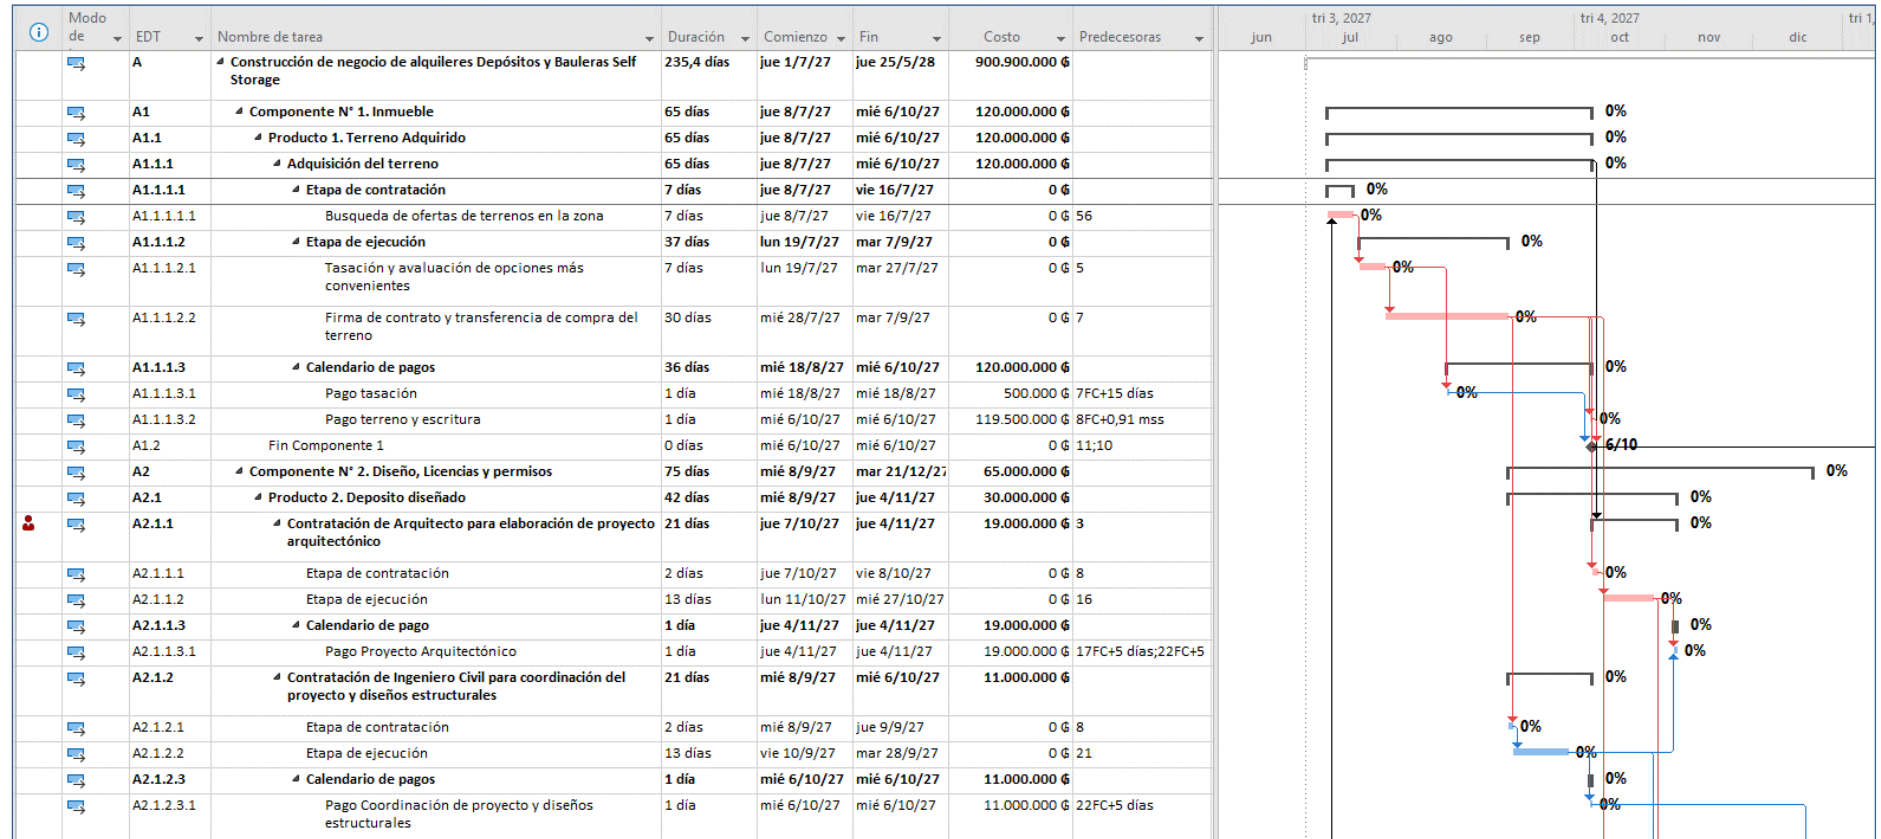

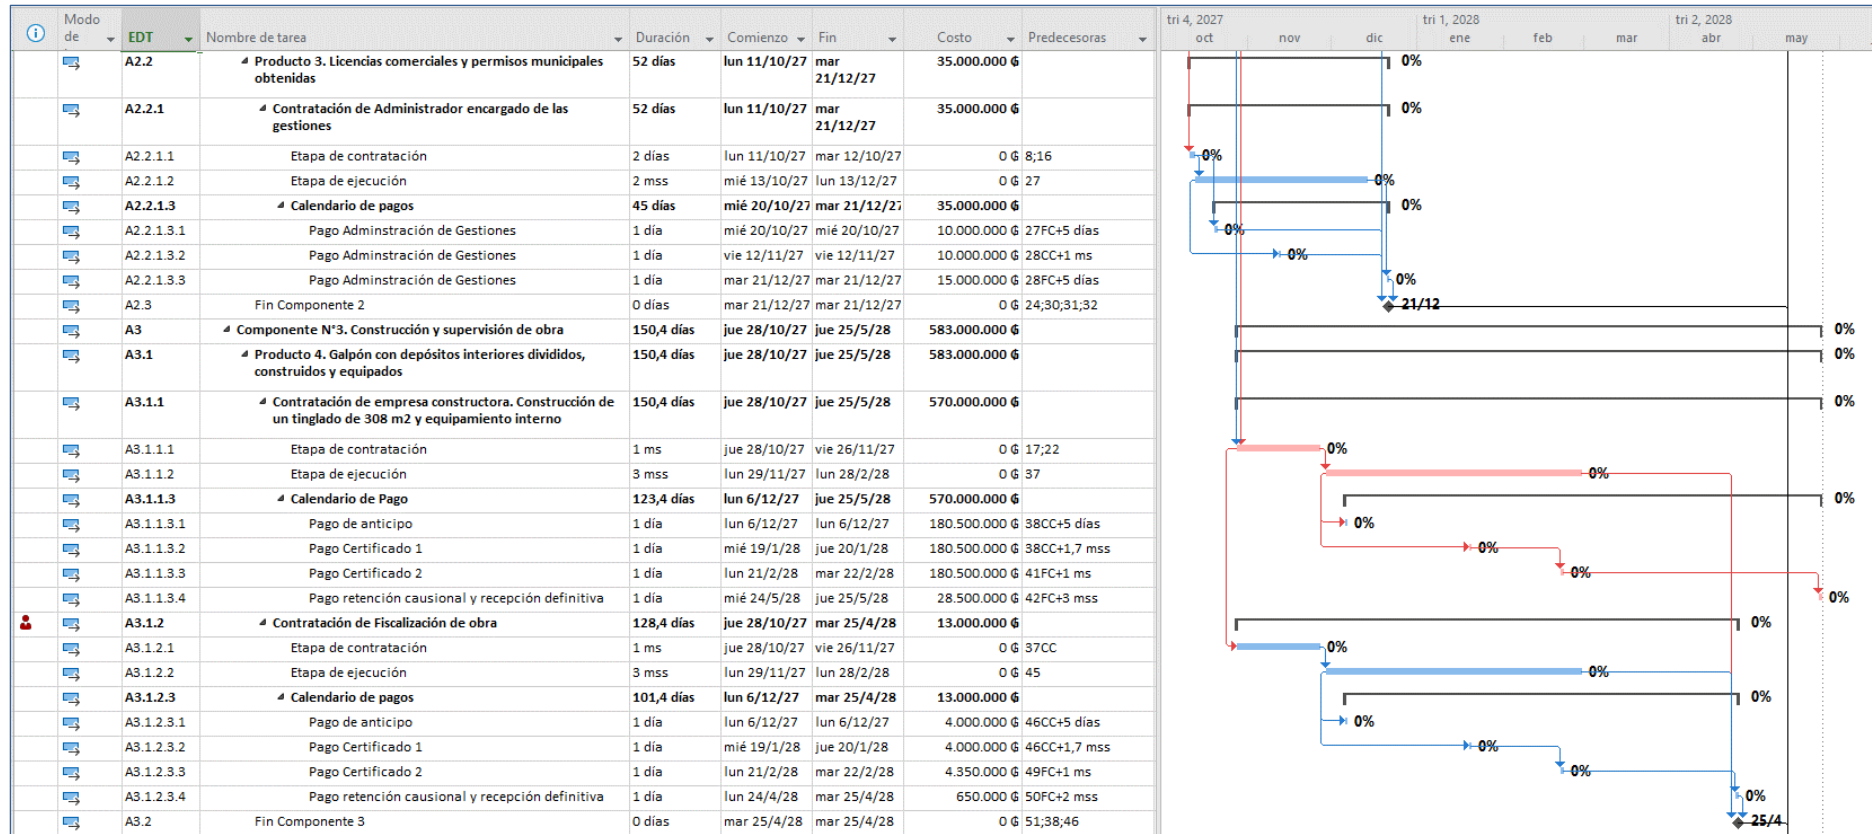



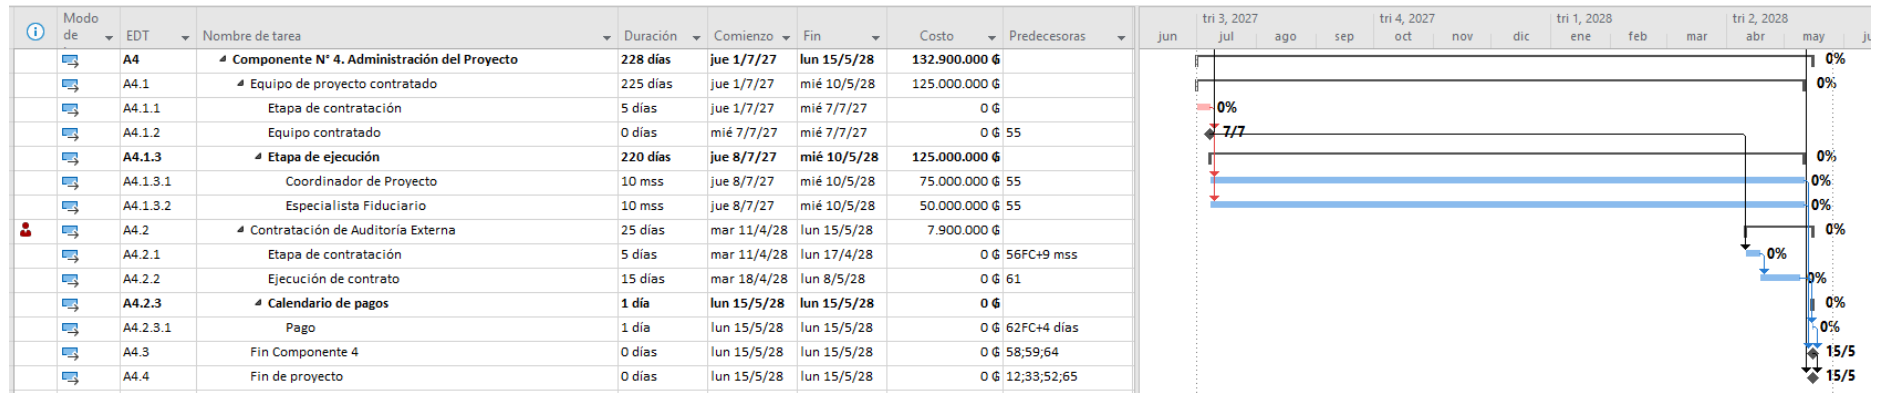

**ANEXO III - CUADRO DE COSTO DETALLADO**

| Código EDT  | Nivel               | Descripción                                             | Costo (Gs.)        | % Participación |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <b>A1</b>   | <b>Componente</b>   | <b>Componente N° 1: Inmueble</b>                        | <b>120.000.000</b> | <b>13,32%</b>   |
| <b>A1.1</b> | <b>Producto</b>     | <b>Producto 1: Terreno Adquirido</b>                    | <b>120.000.000</b> | <b>13,32%</b>   |
| A1.1.1      | Actividad           | Adquisición del terreno                                 | 120.000.000        | 13,32%          |
| A1.1.1.3    | Calendario de pagos | Calendario de pagos                                     | 120.000.000        | 13,32%          |
| A1.1.1.3.1  | Pago                | Pago tasación                                           | 500.000            | 0,06%           |
| A1.1.1.3.2  | Pago                | Pago terreno y escritura                                | 119.500.000        | 13,27%          |
| <b>A2</b>   | <b>Componente</b>   | <b>Componente N° 2: Diseño, Licencias y Permisos</b>    | <b>65.000.000</b>  | <b>7,22%</b>    |
| <b>A2.1</b> | <b>Producto</b>     | <b>Producto 2: Depósito diseñado</b>                    | <b>30.000.000</b>  | <b>3,33%</b>    |
| A2.1.1      | Actividad           | Contratación de Arquitecto (proyecto arquitectónico)    | 19.000.000         | 2,11%           |
| A2.1.1.3    | Calendario de pago  | Calendario de pago                                      | 19.000.000         | 2,11%           |
| A2.1.1.3.1  | Pago                | Pago Proyecto Arquitectónico                            | 19.000.000         | 2,11%           |
| A2.1.2      | Actividad           | Contratación de Ingeniero Civil (diseños estructurales) | 11.000.000         | 1,22%           |
| A2.1.2.3    | Calendario de pagos | Calendario de pagos                                     | 11.000.000         | 1,22%           |
| A2.1.2.3.1  | Pago                | Pago Coordinación de Proyecto y Diseños Estructurales   | 11.000.000         | 1,22%           |

|             |                     |                                                                          |                    |               |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A2.2</b> | <b>Producto</b>     | <b>Producto 3: Licencias comerciales y permisos municipales</b>          | <b>35.000.000</b>  | <b>3,89%</b>  |
| A2.2.1      | Actividad           | Contratación de Administrador de Gestiones                               | 35.000.000         | 3,89%         |
| A2.2.1.3    | Calendario de pagos | Calendario de pagos                                                      | 35.000.000         | 3,89%         |
| A2.2.1.3.1  | Pago                | Pago Administración de Gestiones (1er pago)                              | 10.000.000         | 1,11%         |
| A2.2.1.3.2  | Pago                | Pago Administración de Gestiones (2do pago)                              | 10.000.000         | 1,11%         |
| A2.2.1.3.3  | Pago                | Pago Administración de Gestiones (3er pago)                              | 15.000.000         | 1,67%         |
| <b>A3</b>   | <b>Componente</b>   | <b>Componente N° 3: Construcción y Supervisión de Obra</b>               | <b>583.000.000</b> | <b>64,71%</b> |
| <b>A3.1</b> | <b>Producto</b>     | <b>Producto 4: Galpón con depósitos interiores divididos y equipados</b> | <b>583.000.000</b> | <b>64,71%</b> |
| A3.1.1      | Actividad           | Contratación empresa constructora (tinglado 308 m² + equipamiento)       | 570.000.000        | 63,27%        |
| A3.1.1.3    | Calendario de Pago  | Calendario de Pago                                                       | 570.000.000        | 63,27%        |
| A3.1.1.3.1  | Pago                | Pago de anticipo                                                         | 180.500.000        | 20,04%        |
| A3.1.1.3.2  | Pago                | Pago Certificado 1                                                       | 180.500.000        | 20,04%        |
| A3.1.1.3.3  | Pago                | Pago Certificado 2                                                       | 180.500.000        | 20,04%        |
| A3.1.1.3.4  | Pago                | Pago retención caucional y recepción definitiva                          | 28.500.000         | 3,16%         |
| A3.1.2      | Actividad           | Contratación de Fiscalización de obra                                    | 13.000.000         | 1,44%         |

|             |                     |                                                     |                    |               |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| A3.1.2.3    | Calendario de pagos | Calendario de pagos                                 | 13.000.000         | 1,44%         |
| A3.1.2.3.1  | Pago                | Pago de anticipo                                    | 4.000.000          | 0,44%         |
| A3.1.2.3.2  | Pago                | Pago Certificado 1                                  | 4.000.000          | 0,44%         |
| A3.1.2.3.3  | Pago                | Pago Certificado 2                                  | 4.350.000          | 0,48%         |
| A3.1.2.3.4  | Pago                | Pago retención caucional y recepción definitiva     | 650.000            | 0,07%         |
| <b>A4</b>   | <b>Componente</b>   | <b>Componente N° 4: Administración del Proyecto</b> | <b>132.900.000</b> | <b>14,75%</b> |
| <b>A4.1</b> | <b>Producto</b>     | <b>Equipo de proyecto contratado</b>                | <b>125.000.000</b> | <b>13,88%</b> |
| A4.1.3.1    | Recurso             | Coordinador de Proyecto (10 meses)                  | 75.000.000         | 8,33%         |
| A4.1.3.2    | Recurso             | Especialista Fiduciario (10 meses)                  | 50.000.000         | 5,55%         |
| A4.2        | Actividad           | Contratación de Auditoría Externa                   | 7.900.000          | 0,88%         |
| <b>A</b>    | <b>Total</b>        | <b>TOTAL GENERAL DEL PROYECTO</b>                   | <b>900.900.000</b> | <b>100%</b>   |

## ANEXO IV - MATRIZ DE GESTIÓN DE COSTO

| "Construcción de un Negocio de Alquileres de Depósitos y Bauleras SELF STORAGE en la ciudad de Luque - Paraguay" |       |         |            |             |            |            |       |         |       |       |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|-------------|------------|------------|-------|---------|-------|-------|------|--------------------|
| Estructura del Trabajo                                                                                           | 2027  |         |            |             |            |            | 2028  |         |       |       |      | Costo Estimado (G) |
|                                                                                                                  | Julio | Agosto  | Septiembre | Octubre     | Noviembre  | Diciembre  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo |                    |
| <b>Componente 1: Adquisición del Inmueble</b>                                                                    |       |         |            |             |            |            |       |         |       |       |      | <b>120.000.000</b> |
| Producto 1.1: Terreno adquirido                                                                                  | -     | 500.000 | -          | 119.500.000 | -          | -          | -     | -       | -     | -     | -    | 120.000.000        |
| Servicio de asesoría inmobiliaria (tasación, escritura, transferencia)                                           | -     | 500.000 | -          | 119.500.000 | -          | -          | -     | -       | -     | -     | -    | 120.000.000        |
| <b>Componente 2: Diseño, Licencias y Permisos</b>                                                                |       |         |            |             |            |            |       |         |       |       |      | <b>65.000.000</b>  |
| Producto 2.1: Depósito diseñado                                                                                  | -     | -       | -          | 11.000.000  | 19.000.000 | -          | -     | -       | -     | -     | -    | 30.000.000         |
| Servicio de consultoría – Ingeniero Civil (coordinación y diseño estructural)                                    | -     | -       | -          | 11.000.000  | -          | -          | -     | -       | -     | -     | -    | 11.000.000         |
| Servicio de consultoría – Arquitecto (proyecto arquitectónico)                                                   | -     | -       | -          | -           | 19.000.000 | -          | -     | -       | -     | -     | -    | 19.000.000         |
| Producto 2.2: Licencias comerciales y permisos municipales obtenidos                                             | -     | -       | -          | 10.000.000  | 10.000.000 | 15.000.000 | -     | -       | -     | -     | -    | 35.000.000         |
| Servicio de gestión – Administrador de trámites                                                                  | -     | -       | -          | 10.000.000  | 10.000.000 | 15.000.000 | -     | -       | -     | -     | -    | 35.000.000         |

| <b>Componente 3: Construcción y Supervisión de Obra</b>                        |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   | <b>583.000.000</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Producto 3.1: Galpón con depósitos interiores divididos, construido y equipado | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | 184.500.000        | 184.500.000        | 184.850.000        | -                 | 650.000           | 28.500.000        | 583.000.000        |
| Servicio de contratista – Construcción tinglado 308 m² y equipamiento          | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | 180.500.000        | 180.500.000        | 180.500.000        | -                 | -                 | 28.500.000        | 570.000.000        |
| Servicio de consultoría – Fiscalización de obra                                | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | 4.000.000          | 4.000.000          | 4.350.000          | -                 | 650.000           | -                 | 13.000.000         |
| <b>Componente 4: Administración del Proyecto</b>                               |                   |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                    |                   |                   |                   | <b>132.900.000</b> |
| Producto 4.1: Equipo de proyecto contratado                                    | 12.500.000        | 12.500.000        | 12.500.000        | 12.500.000         | 12.500.000        | 12.500.000         | 12.500.000         | 12.500.000         | 12.500.000        | 12.500.000        | -                 | 125.000.000        |
| Coordinador de Proyecto                                                        | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000         | 7.500.000          | 7.500.000         | 7.500.000          | 7.500.000          | 7.500.000          | 7.500.000         | 7.500.000         | -                 | 75.000.000         |
| Especialista Fiduciario                                                        | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000          | 5.000.000         | 5.000.000          | 5.000.000          | 5.000.000          | 5.000.000         | 5.000.000         | -                 | 50.000.000         |
| Producto 4.2: Auditoría externa contratada                                     | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | 7.900.000         | 7.900.000          |
| Servicio de consultoría – Auditoría externa                                    | -                 | -                 | -                 | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                 | 7.900.000         | 7.900.000          |
| <b>TOTAL, POR MES (G)</b>                                                      | <b>12.500.000</b> | <b>13.000.000</b> | <b>12.500.000</b> | <b>153.000.000</b> | <b>41.500.000</b> | <b>212.000.000</b> | <b>197.000.000</b> | <b>197.350.000</b> | <b>12.500.000</b> | <b>13.150.000</b> | <b>36.400.000</b> | <b>900.900.000</b> |
